



Management de projet Introduction

Prof. Ph. WIESER

EPFL - CDM/IML
2024




Le mot *projet* provient du mot latin *projectum* de *projicere*, «jeter quelque chose vers l'avant» dont le préfixe *pro* signifie «qui précède dans le temps». Un projet est une **aventure temporaire** entreprise dans le but de créer un produit ou un service unique [Wikipédia]



Un projet est un **processus d'action** construit à partir d'un **diagnostic** de situation, du choix d'objectifs cohérents par rapport à cette situation et de différents moyens à mettre en œuvre pour répondre à une problématique précise. Les actions, articulées entre elles, visent à transformer la «situation initiale insatisfaisante» en «situation résultante satisfaisante». Les résultats sont **mesurables et programmés** dans le temps. L'élaboration est collective tout comme son objet. [J.-P. Jeannin, socio-analyste]

Réalisation **unique, limitée dans le temps** et comportant un ensemble de tâches cohérentes, utilisant des ressources humaines, matérielles et financières afin d'atteindre un but fixé tout en respectant les contraintes Temps Coût Qualité. [Tilos]

Processus unique, complexe, à risques et limité dans le temps devant répondre à des objectifs mesurables clairs et précis

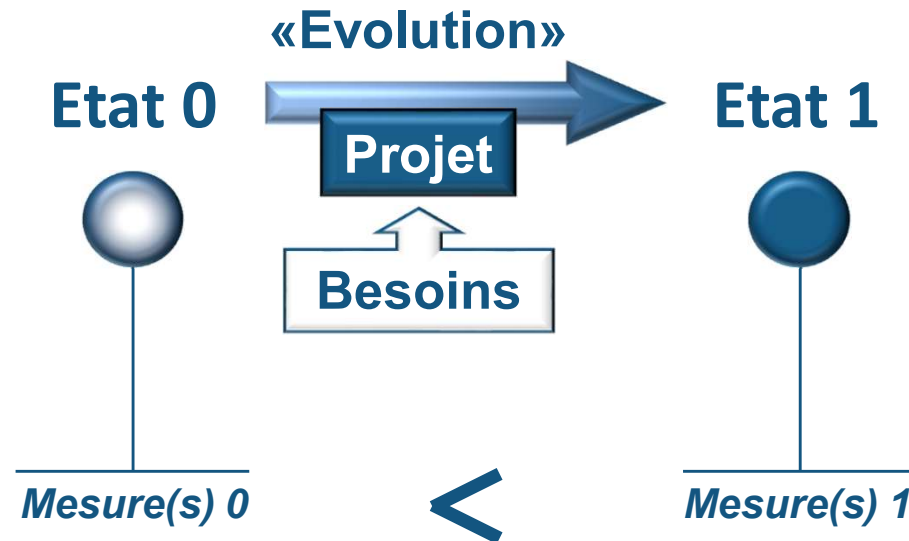


On ne gère et on améliore que ce que l'on mesure


Le Management de PROJET

Le *MANAGEMENT de PROJET* est une démarche permettant, grâce à l'application de méthodes, de techniques et d'outils, de réaliser, sous contraintes et par rapport aux besoins exprimés, l'ensemble des objectifs du projet en intégrant les dimensions humaines et matérielles dans une approche systémique prenant en compte les risques internes et externes au projet.

Objectifs du cours

Présenter par quelques chapitres choisis, les méthodes, les outils et les compétences nécessaires à tout responsable de projet.

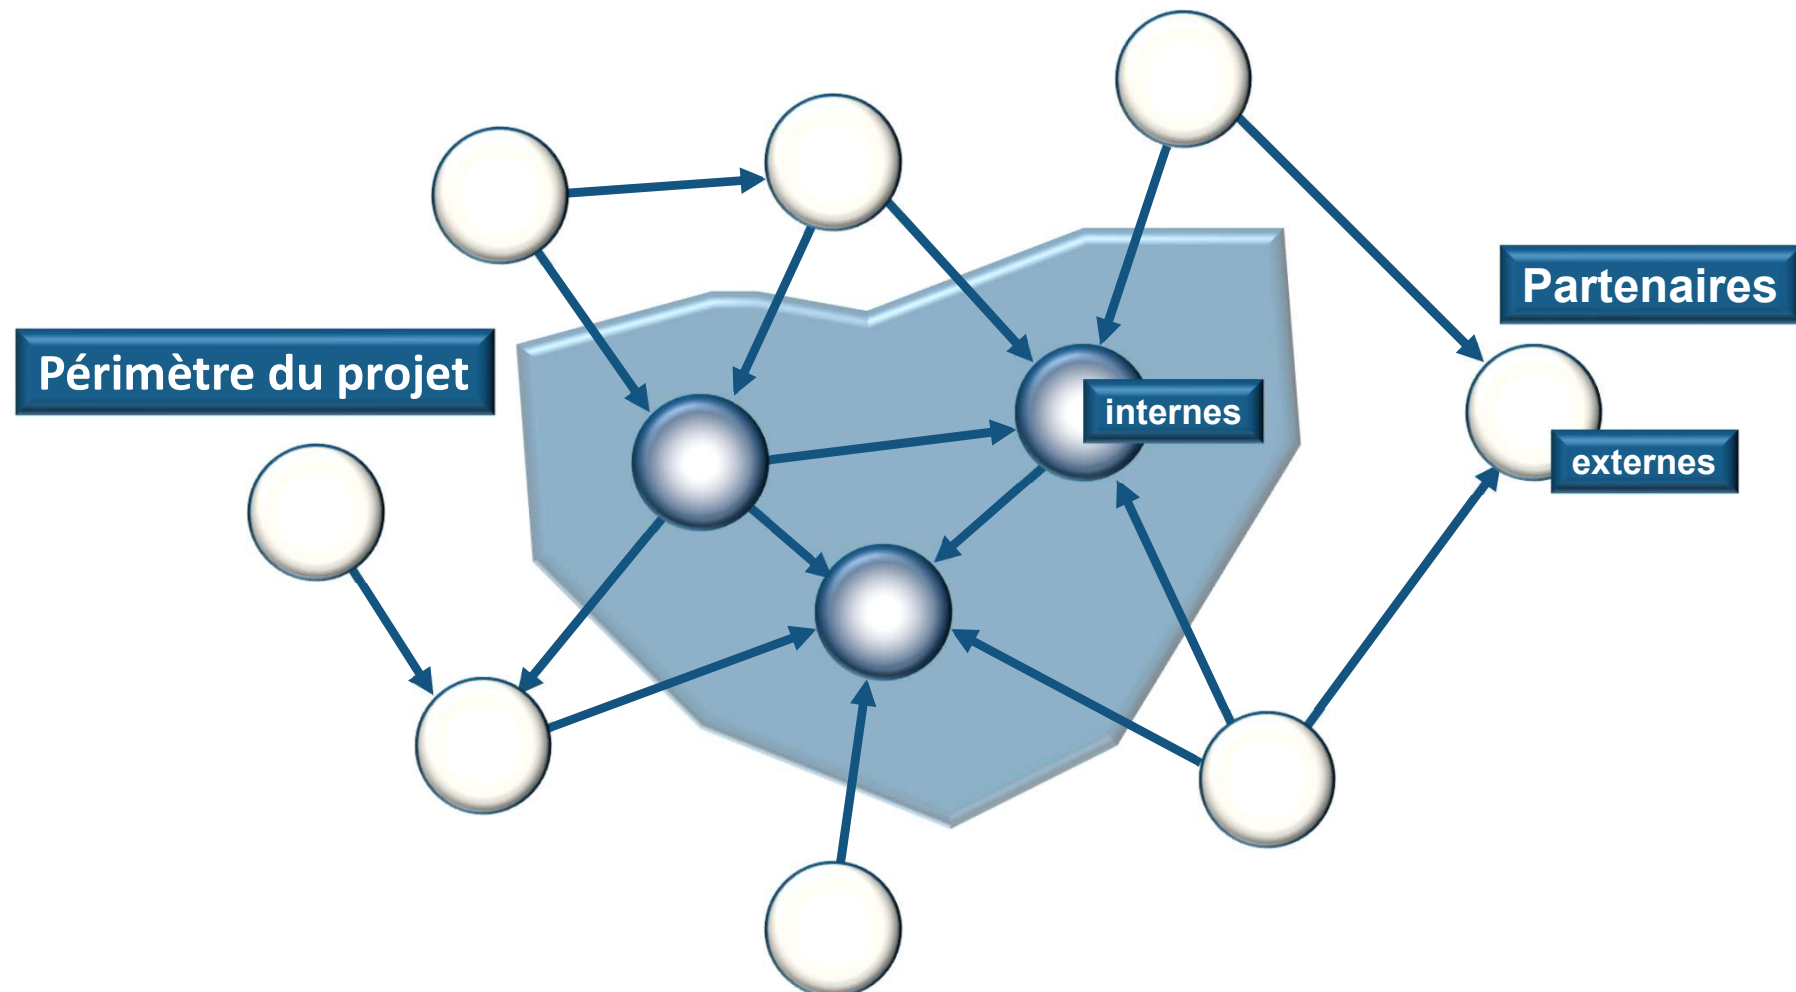Le Management de PROJET**Une approche systémique**

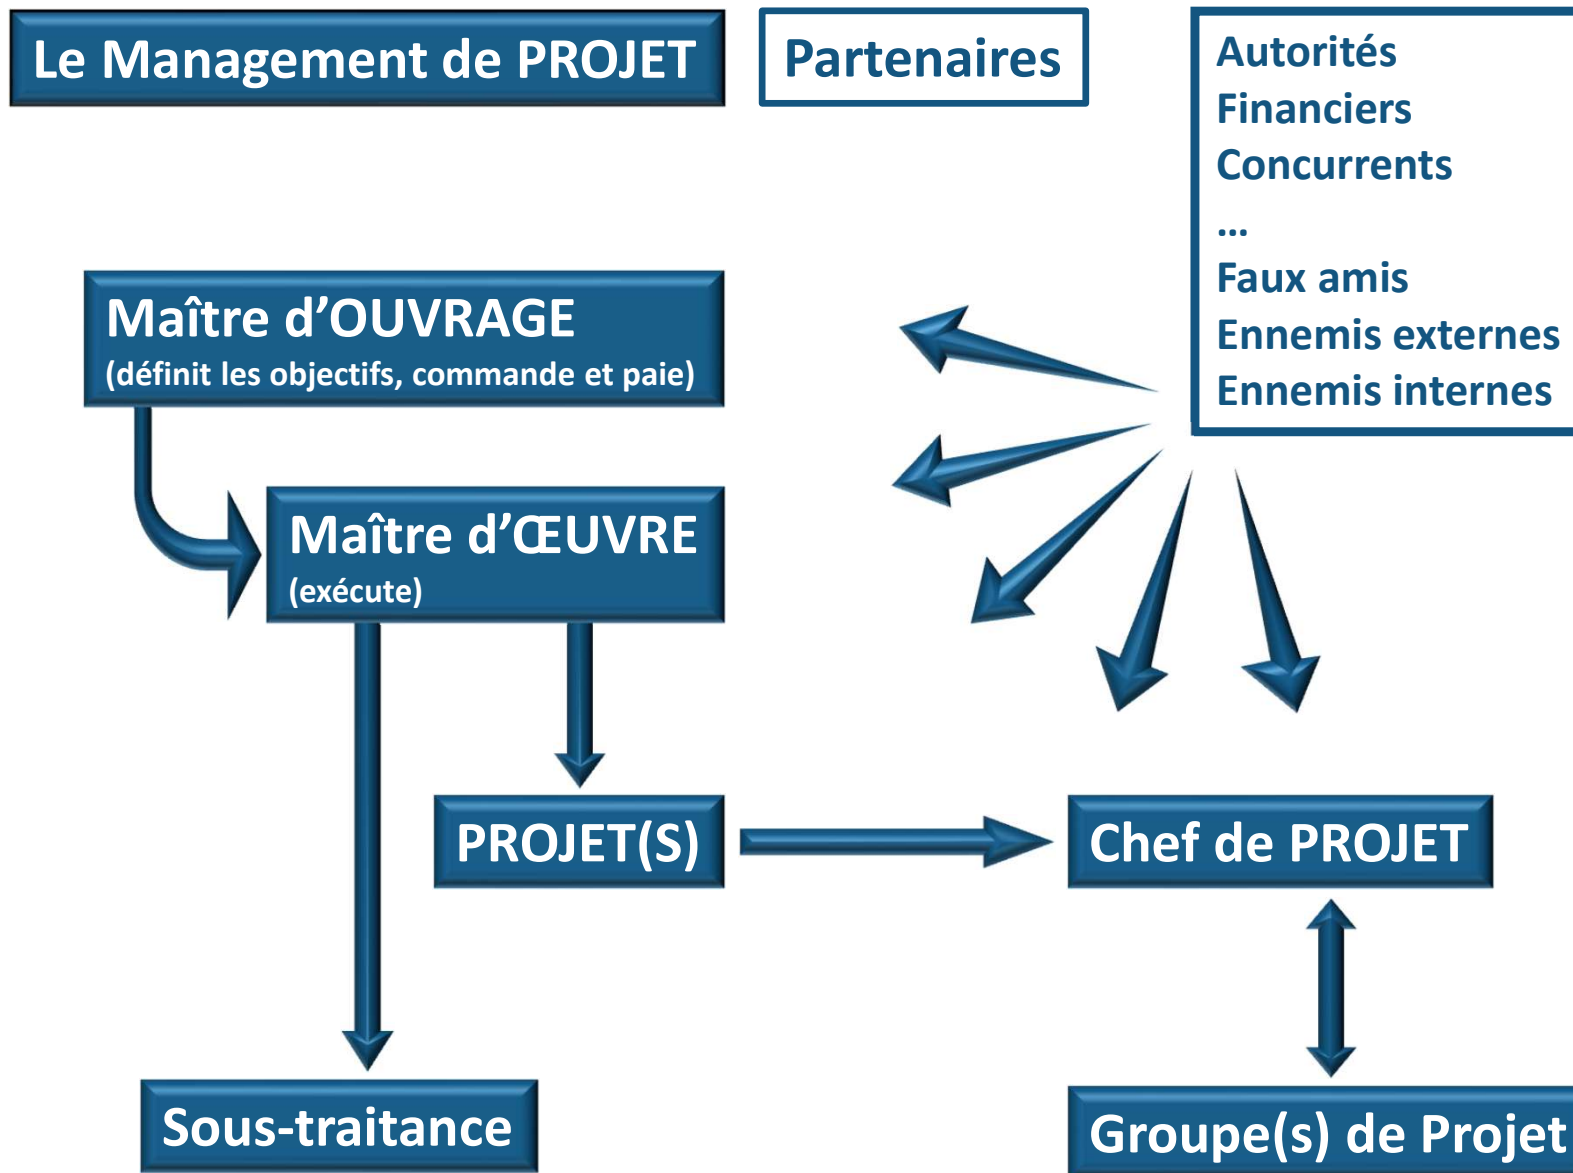

Le Management de PROJET


Démarche

Les projets s'inscrivent généralement dans un processus d'amélioration:

- amélioration continue
- concept nouveau, innovation, construction/réalisation nouvelle




La roue de Deming

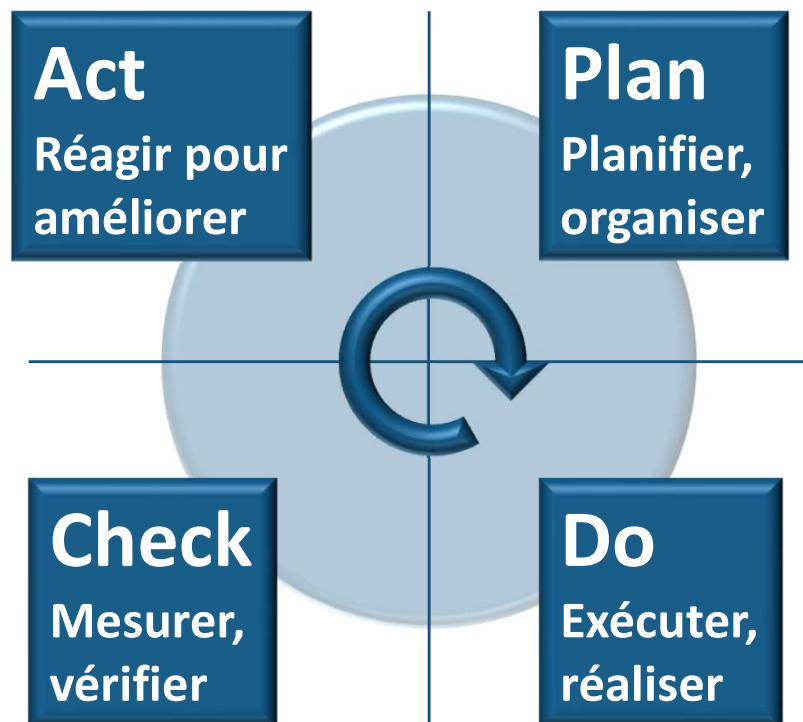

Le Management de PROJET


Compétences du chef de projet

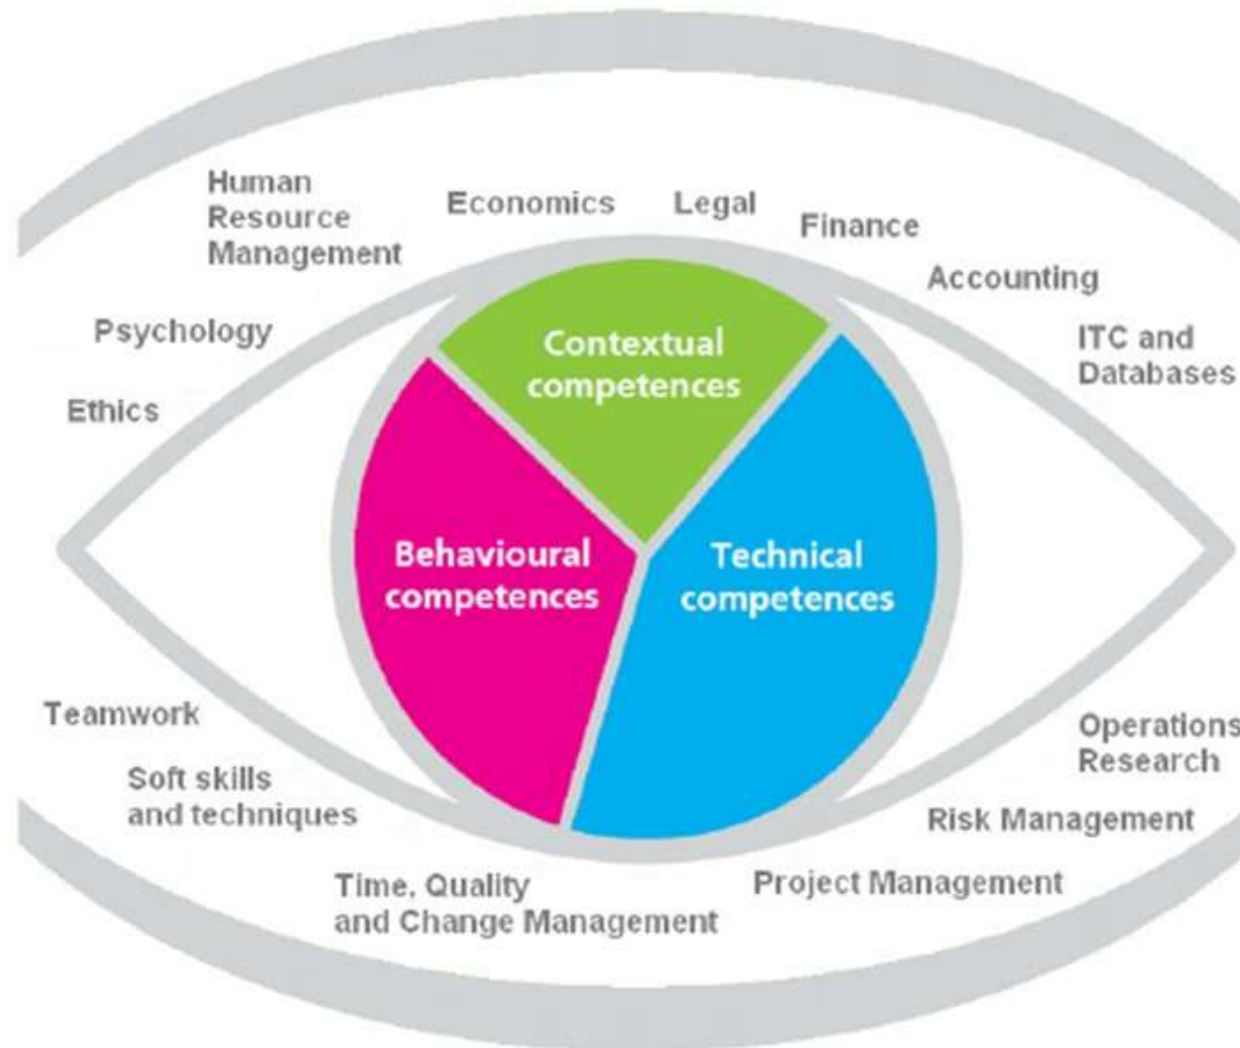

IPMA®


Le Management de PROJET

Organisation de projet

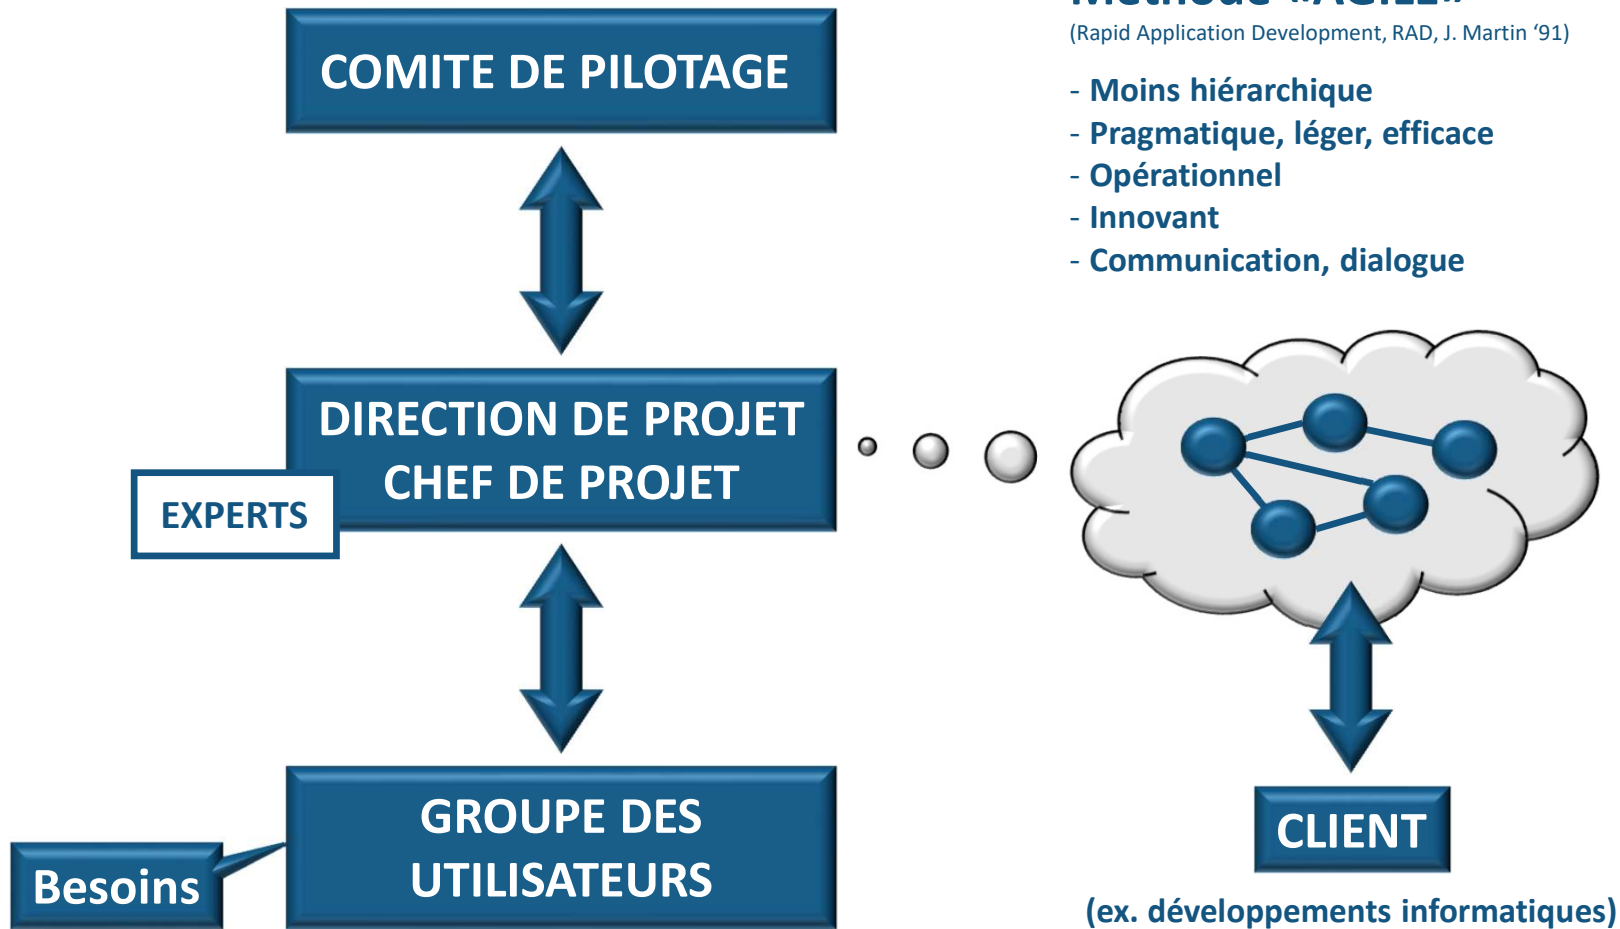

Le Management de PROJET

Organisation de projet

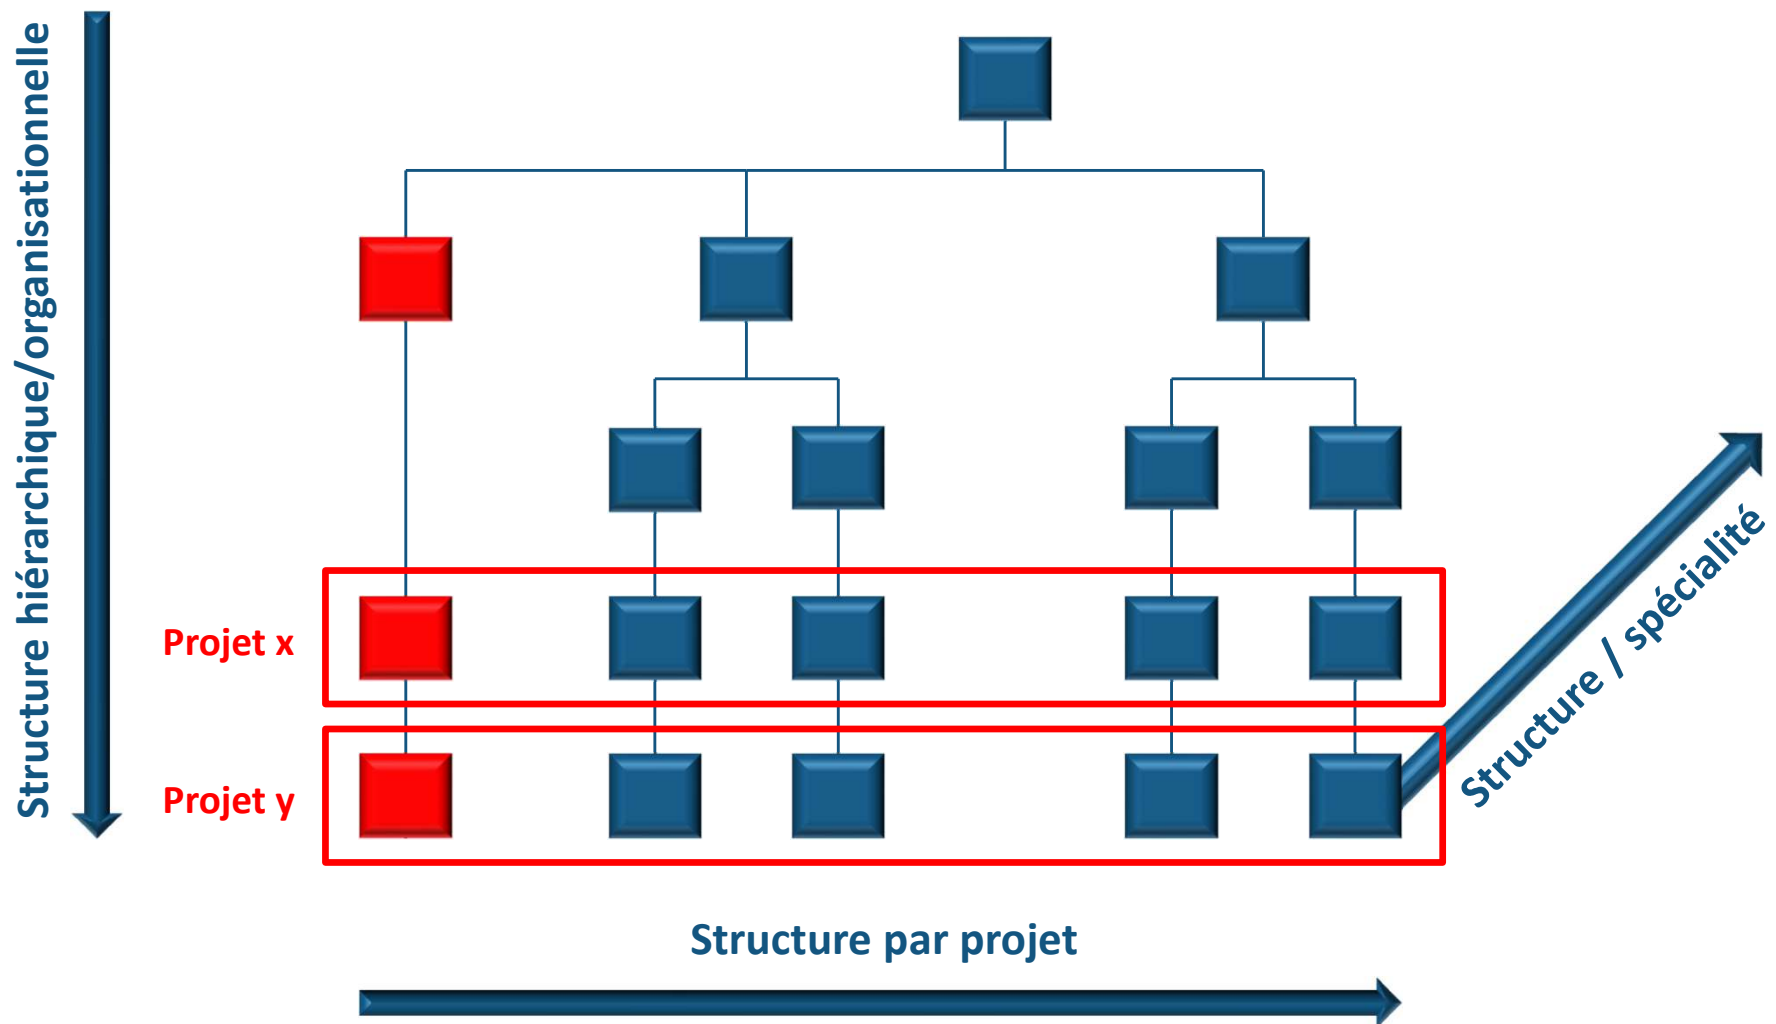


Le Management de PROJET


Organisation de projet et réalisation

Application au Génie Civil


Organisation traditionnelle

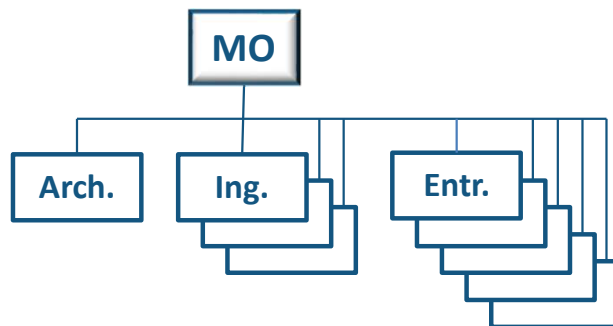


Entreprise générale

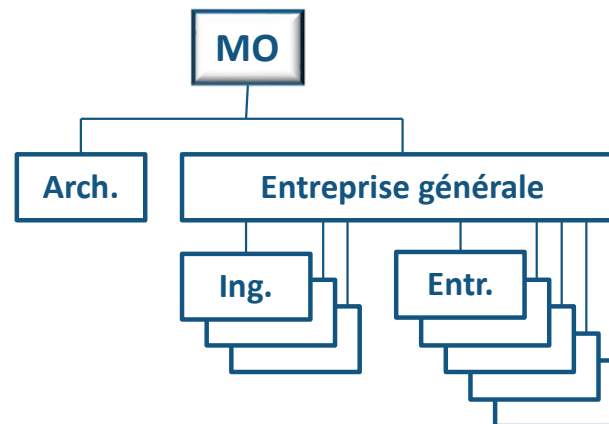


Entreprise totale

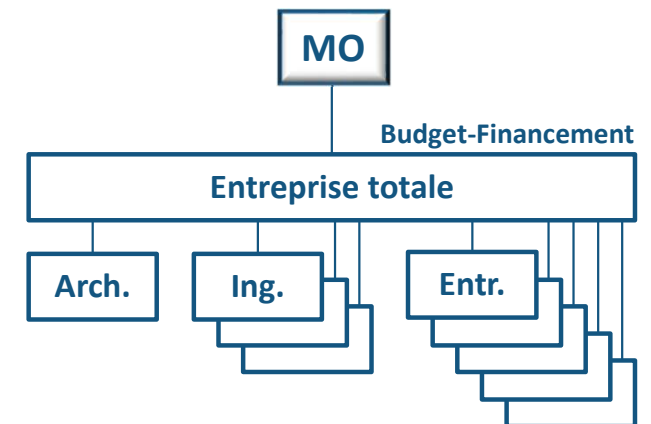


Cycle de vie d'un projet

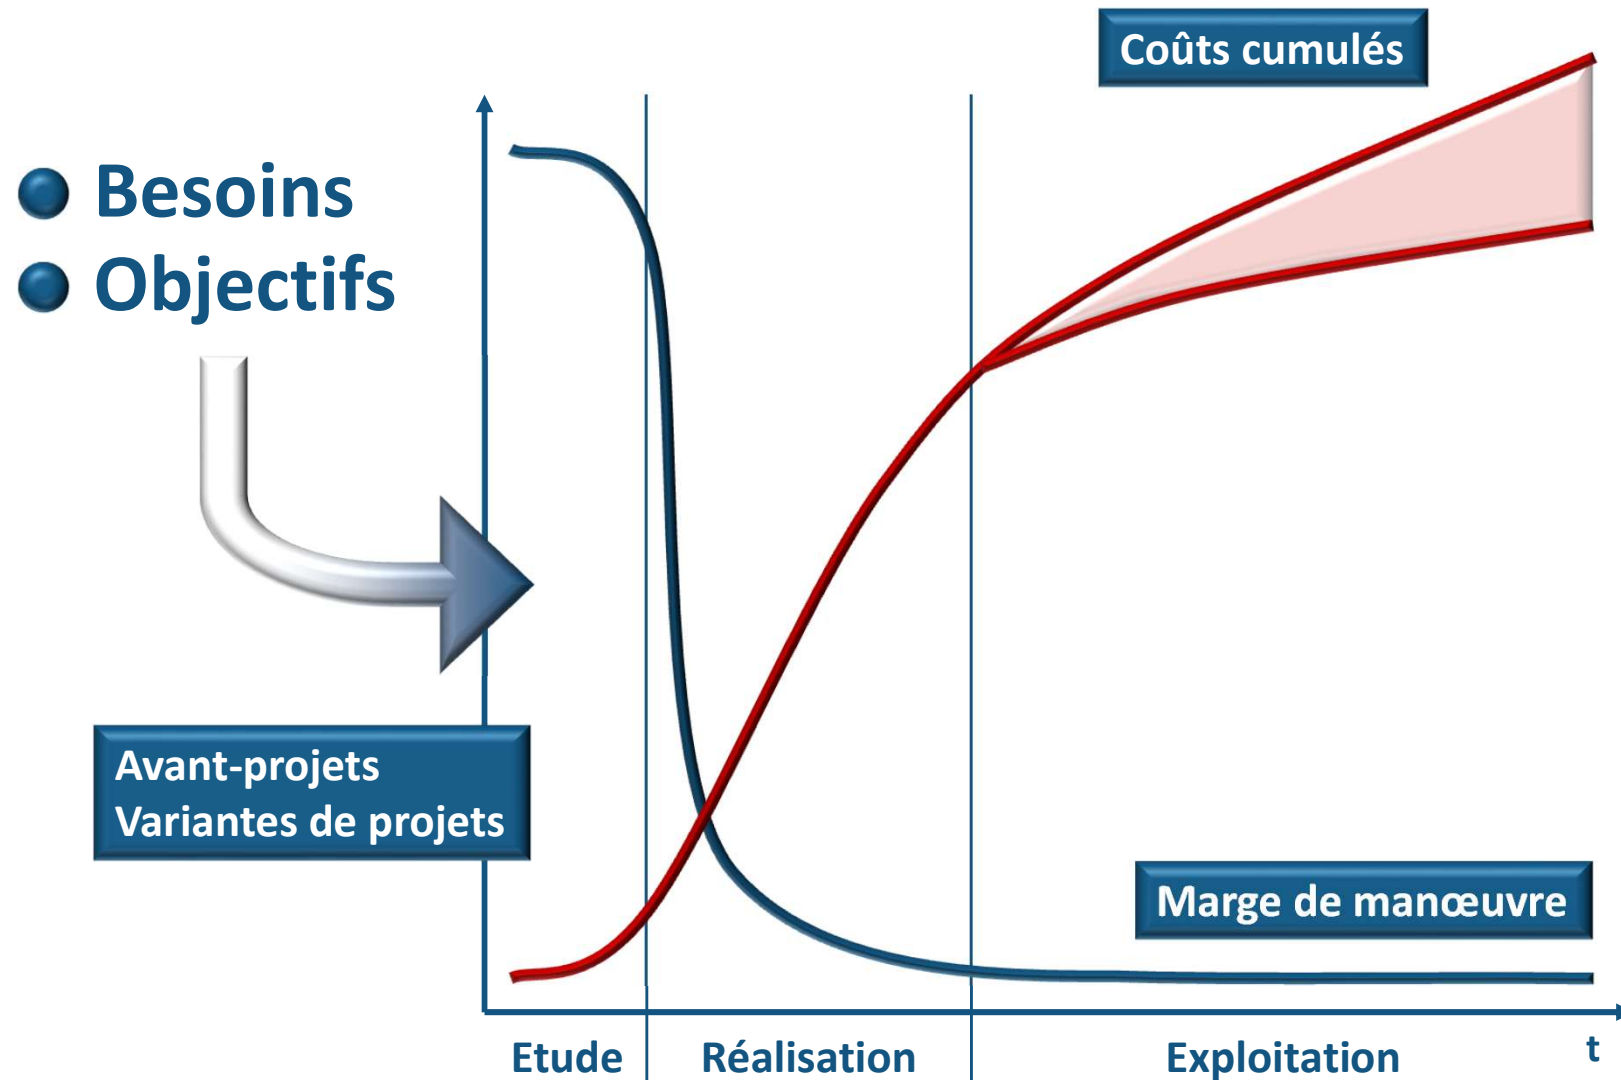


Cycle de vie d'un projet

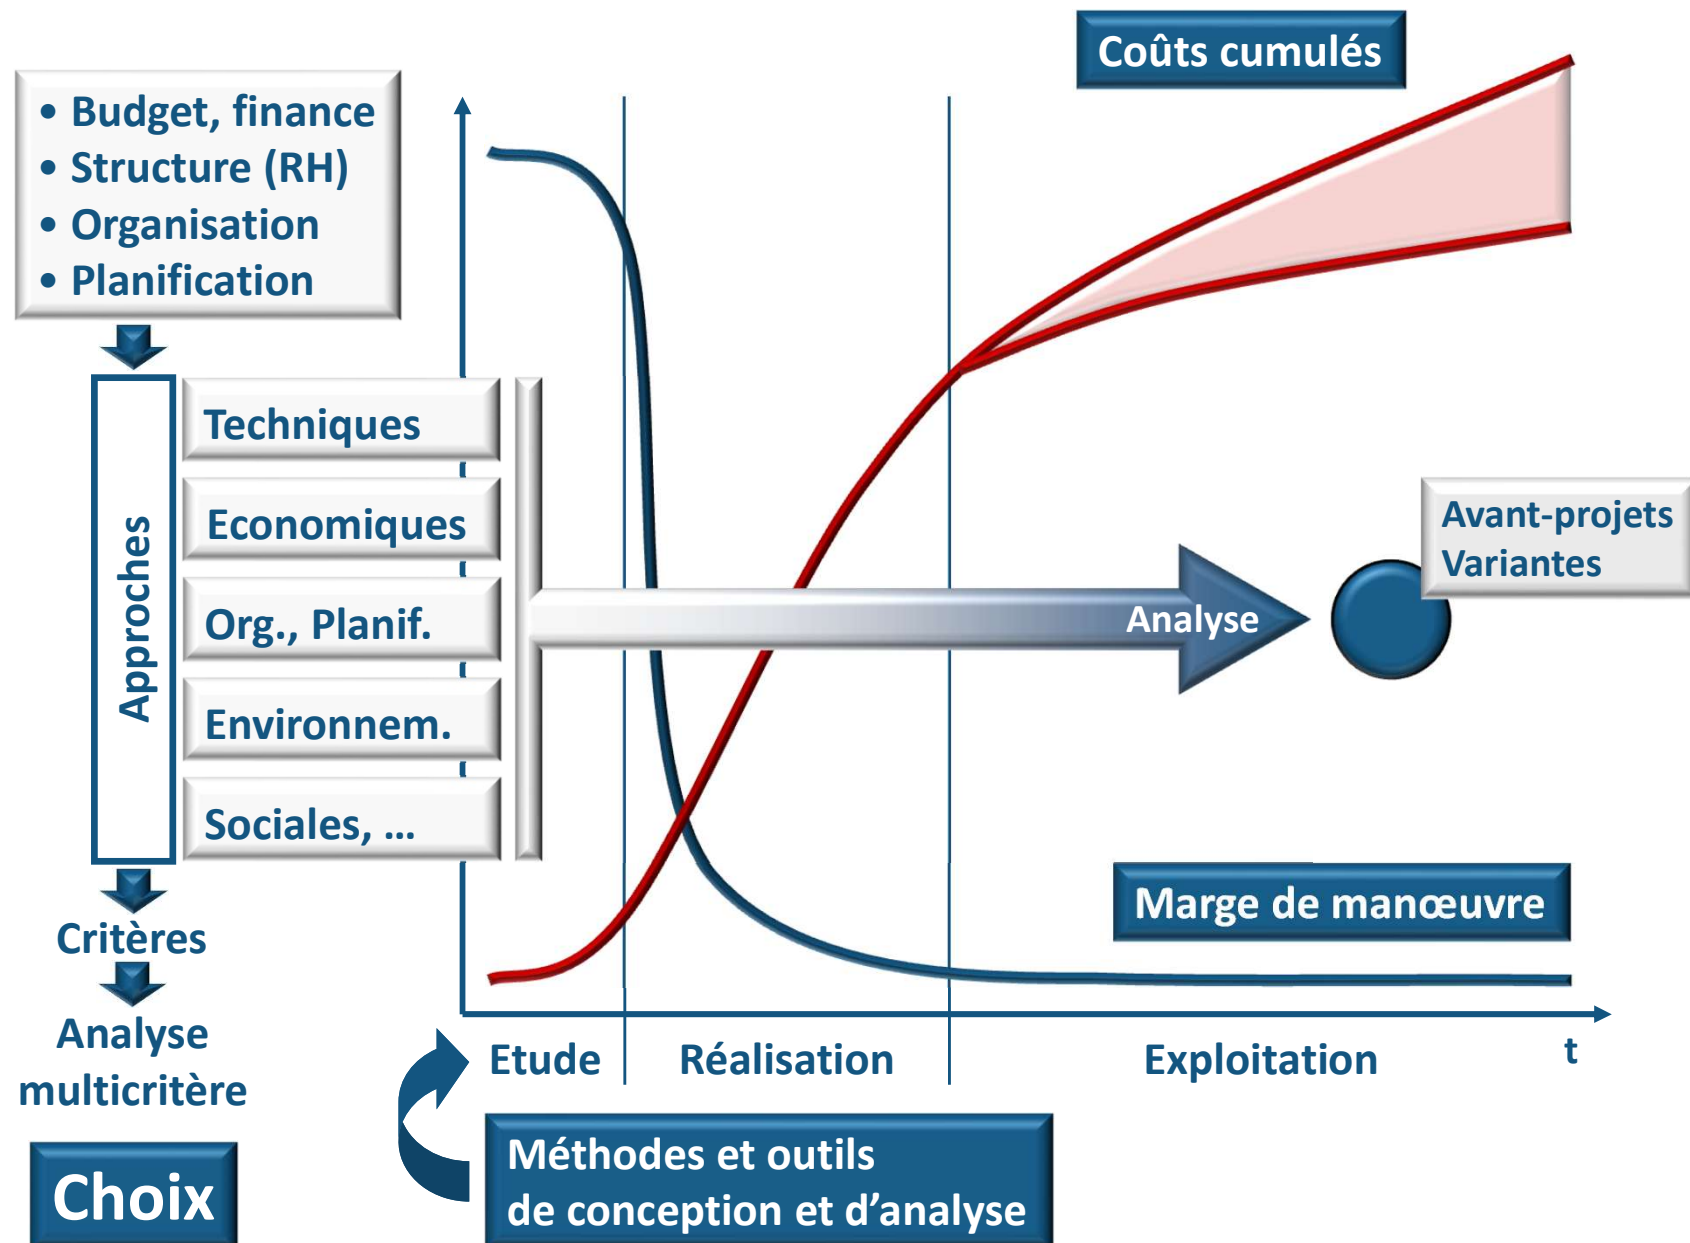

Cycle de vie d'un projet

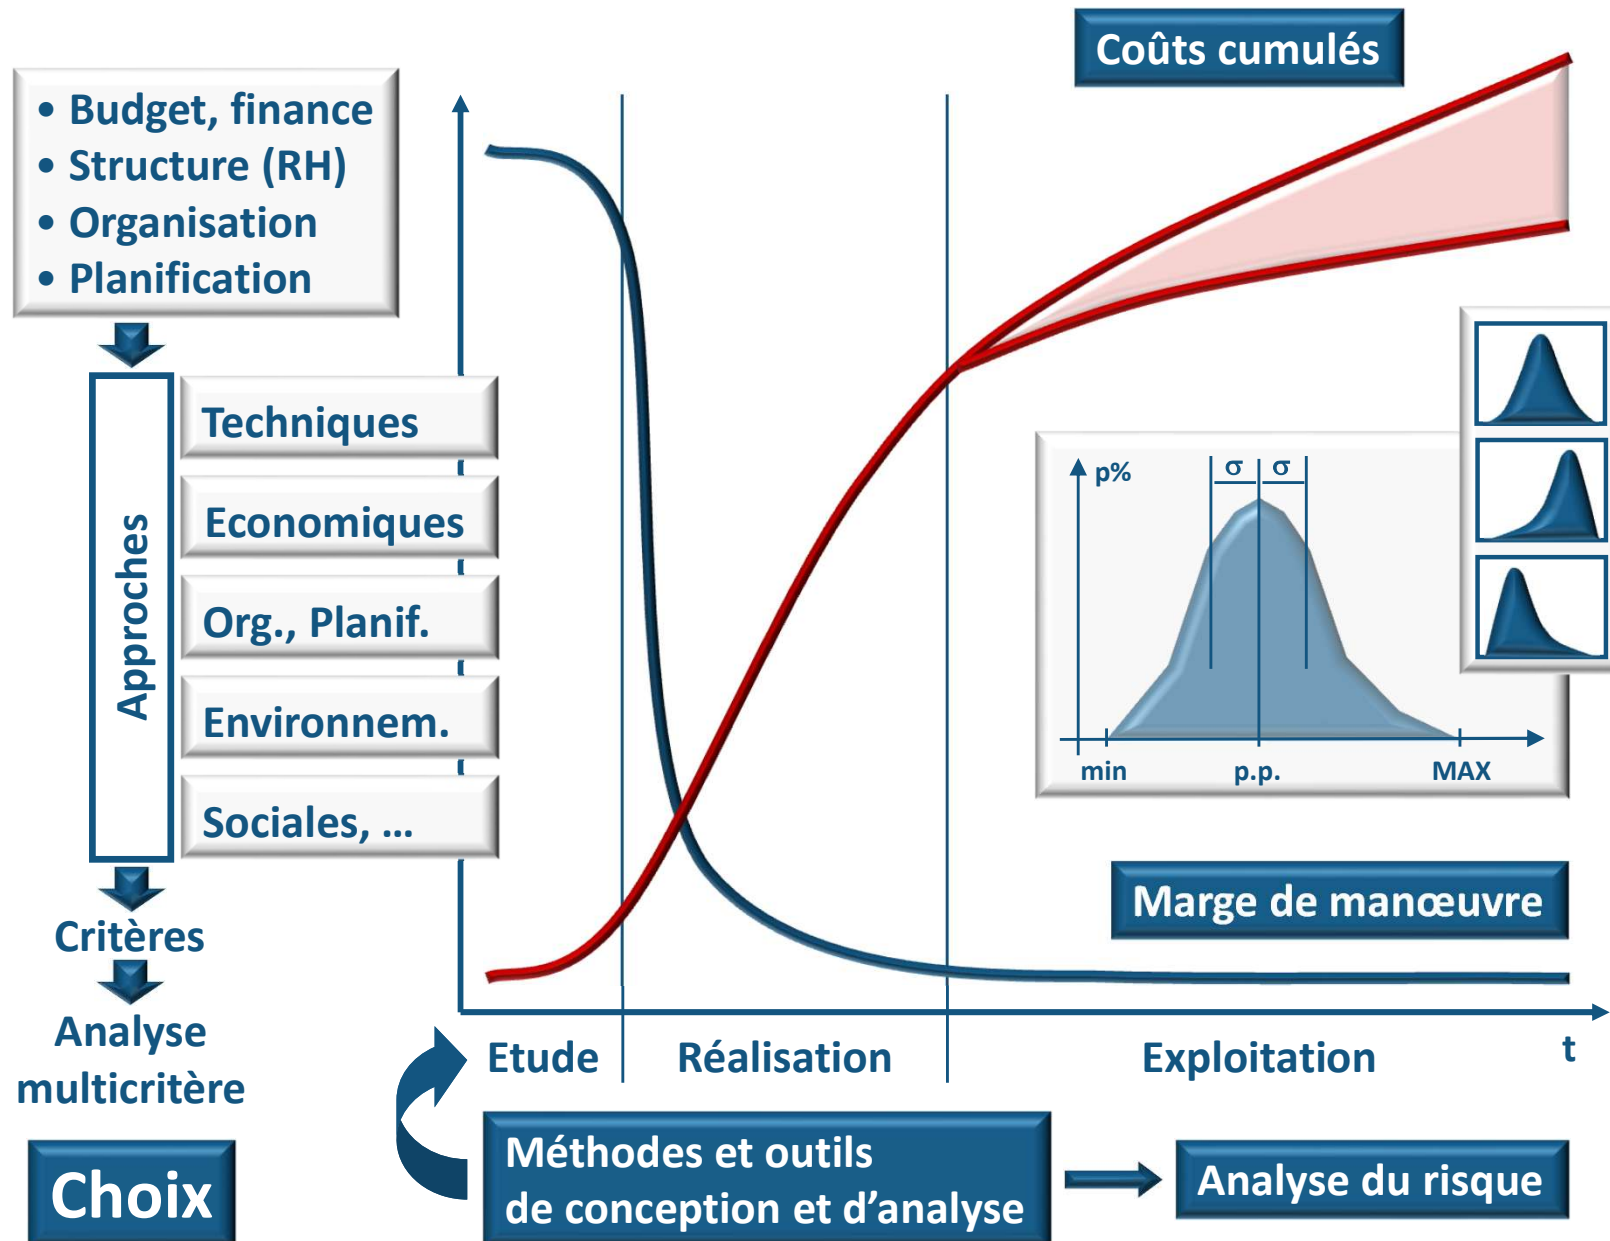

Variantes de projet, remarque

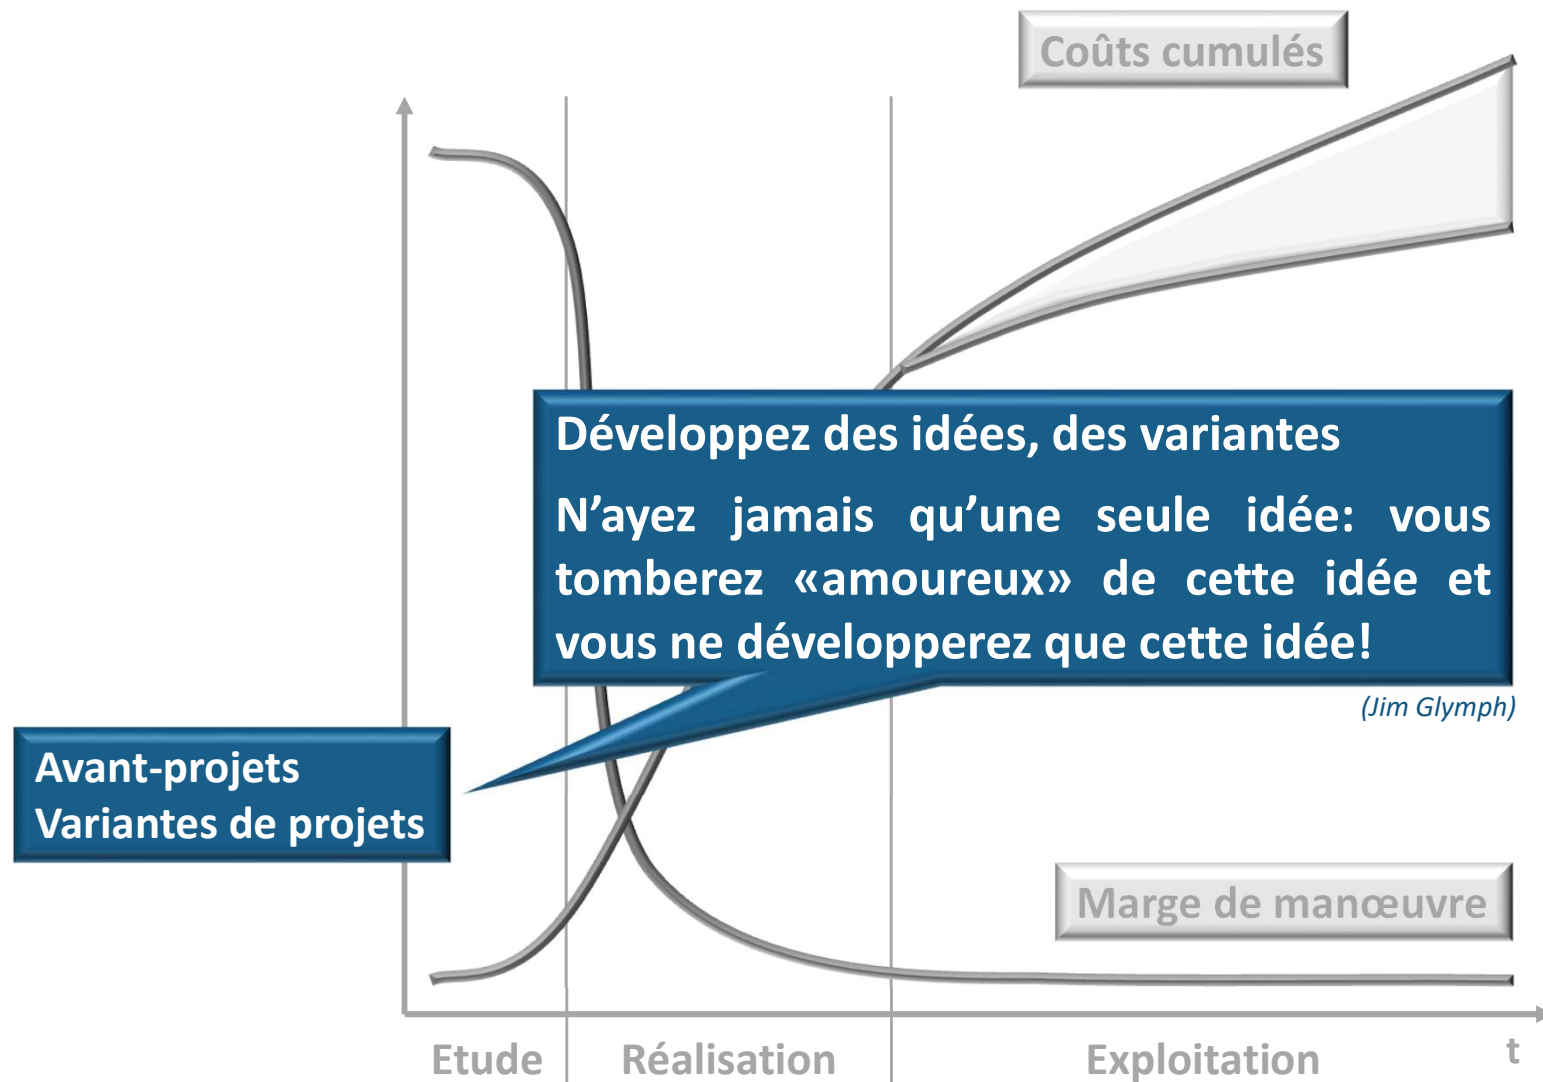

Le projet doit répondre aux besoins des futurs utilisateurs

➔ **Diagnostic de situation**

Etat 0



- Démarche, méthodologie
- Méthodes et outils



Etude

Variantes (solutions potentielles)

Choix





Réalisation






Exploitation

Méthodes de management de projet

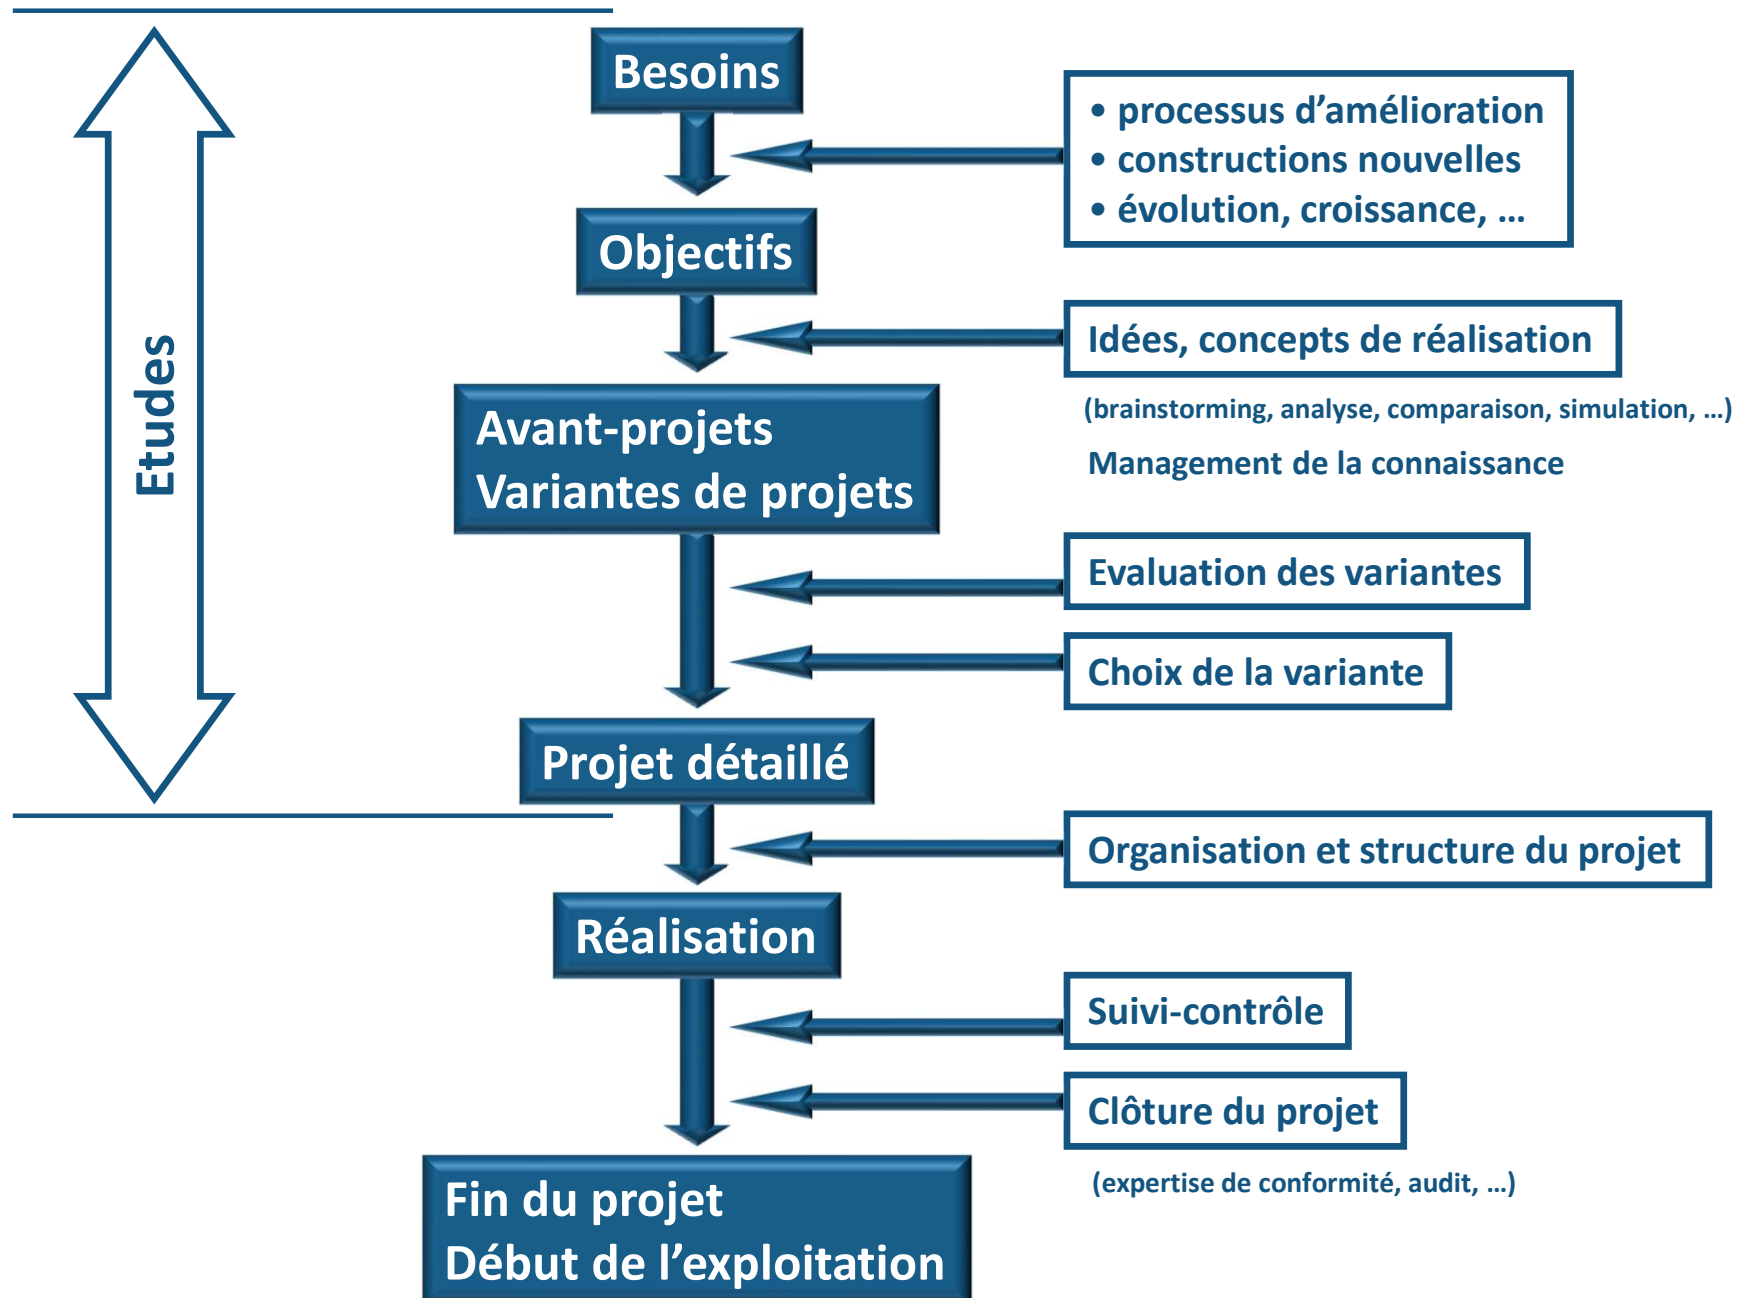

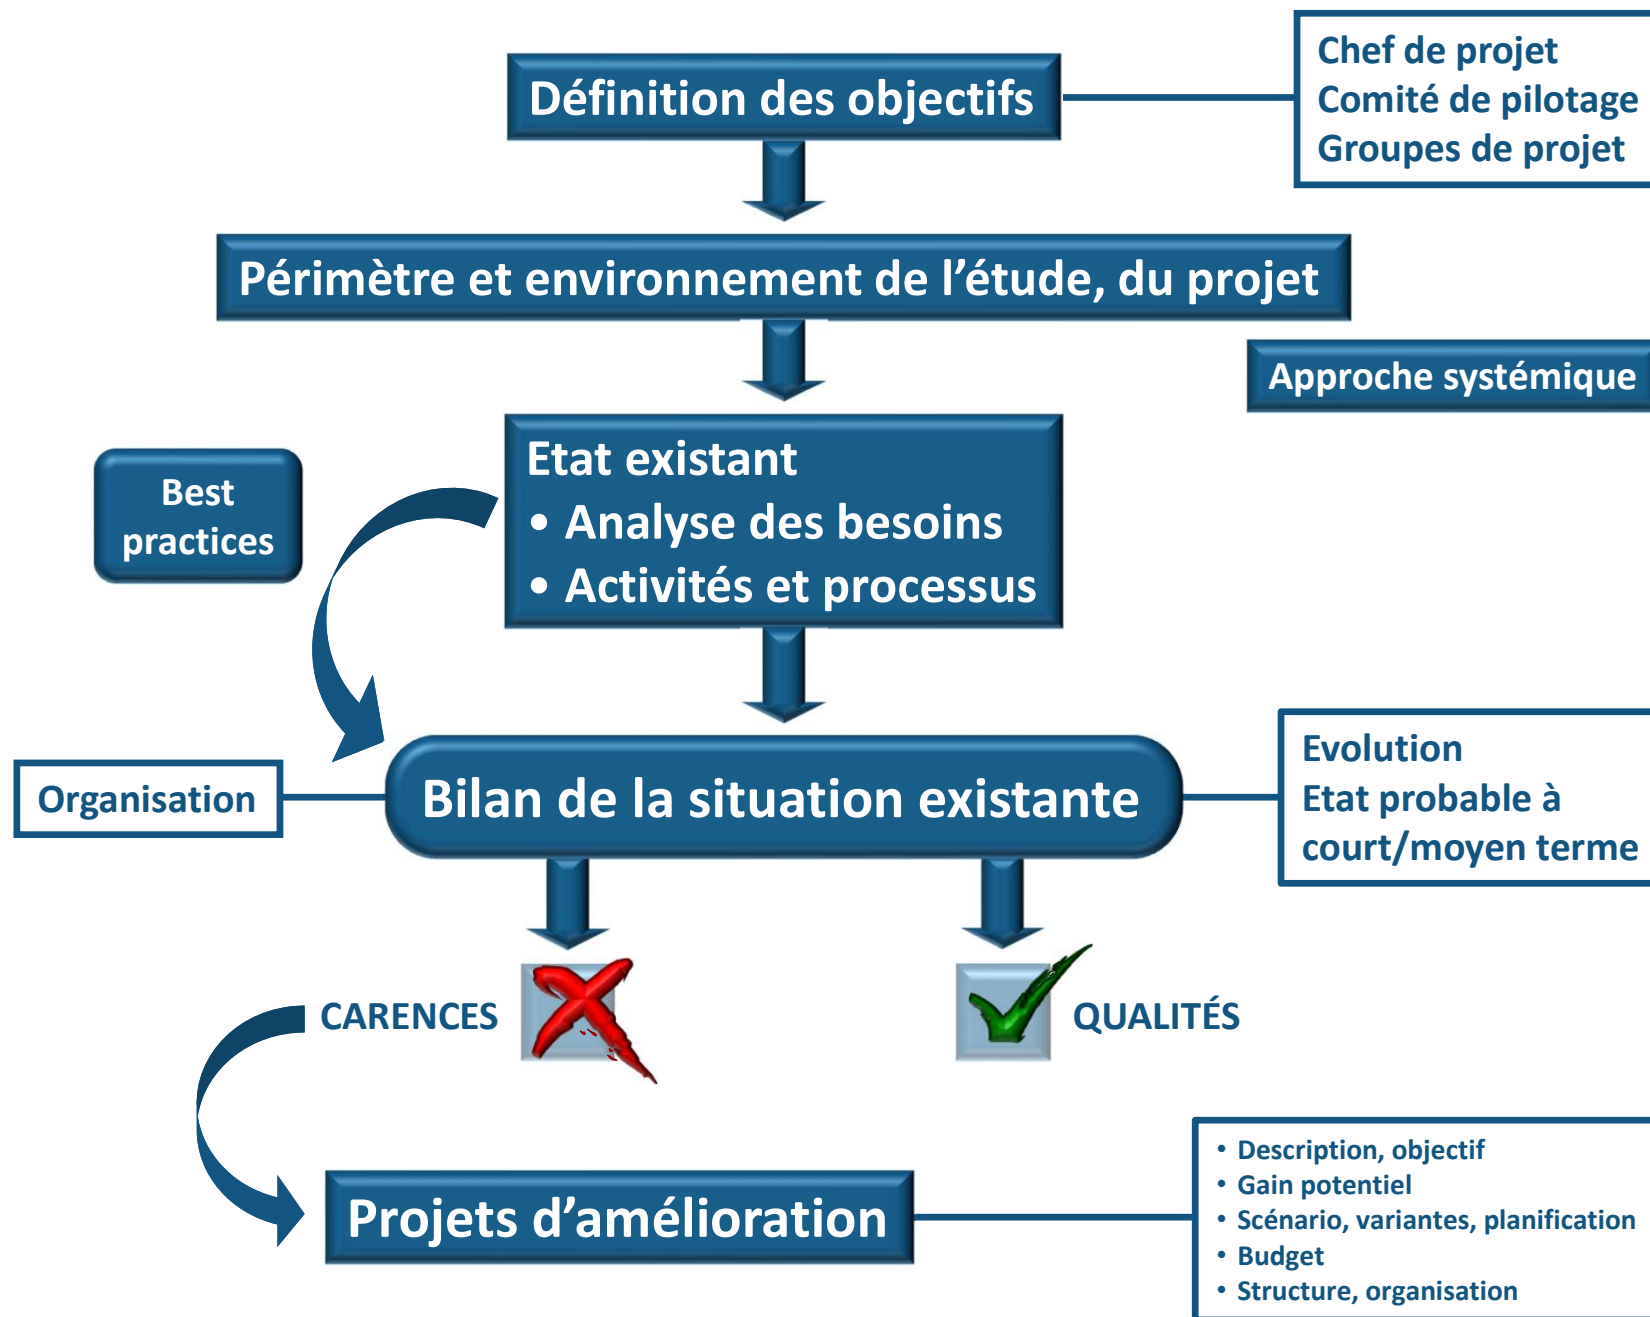


L'approche «processus»

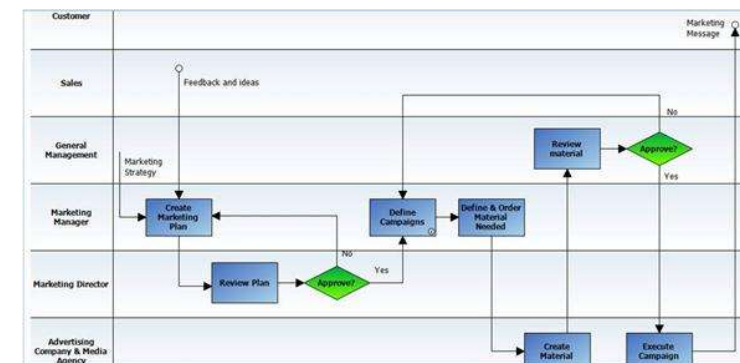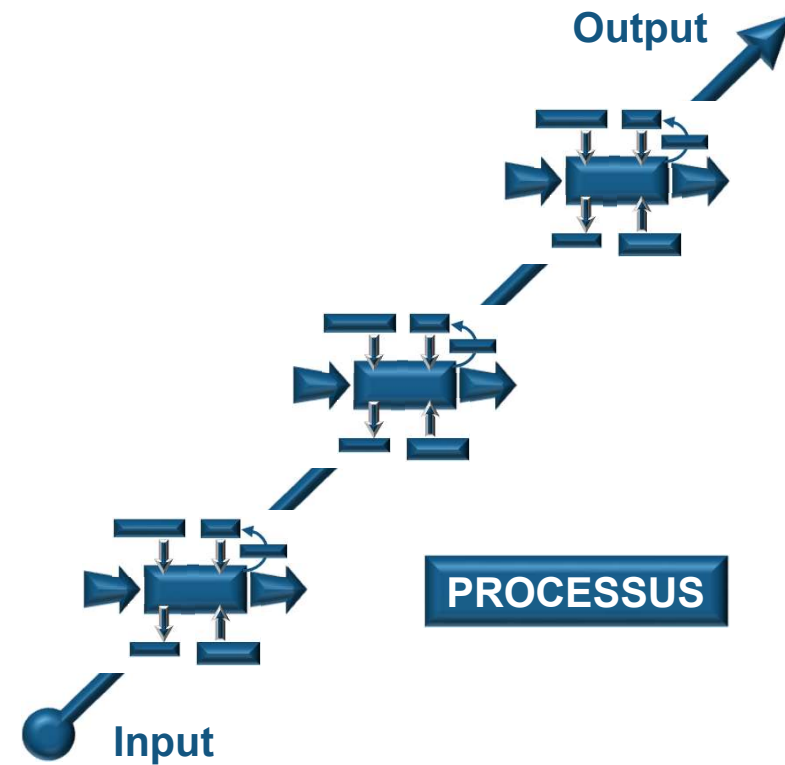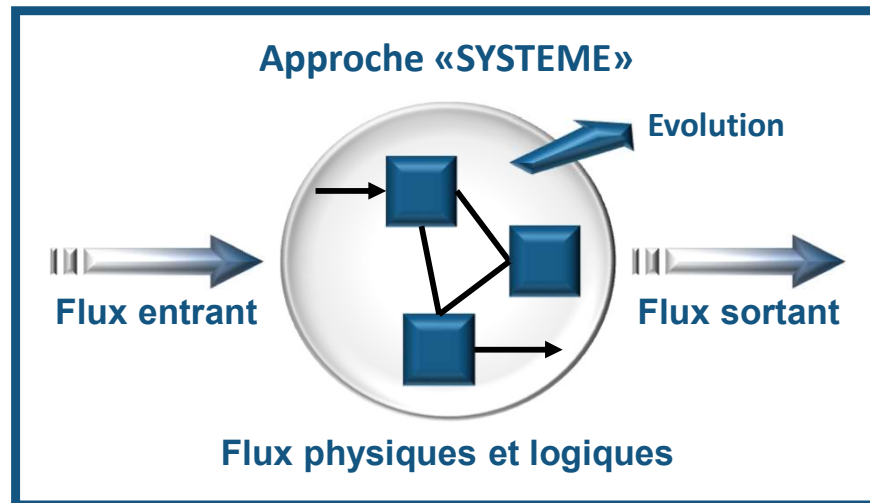

(réf. SIGNOS)

L'approche «processus»

Brown paper

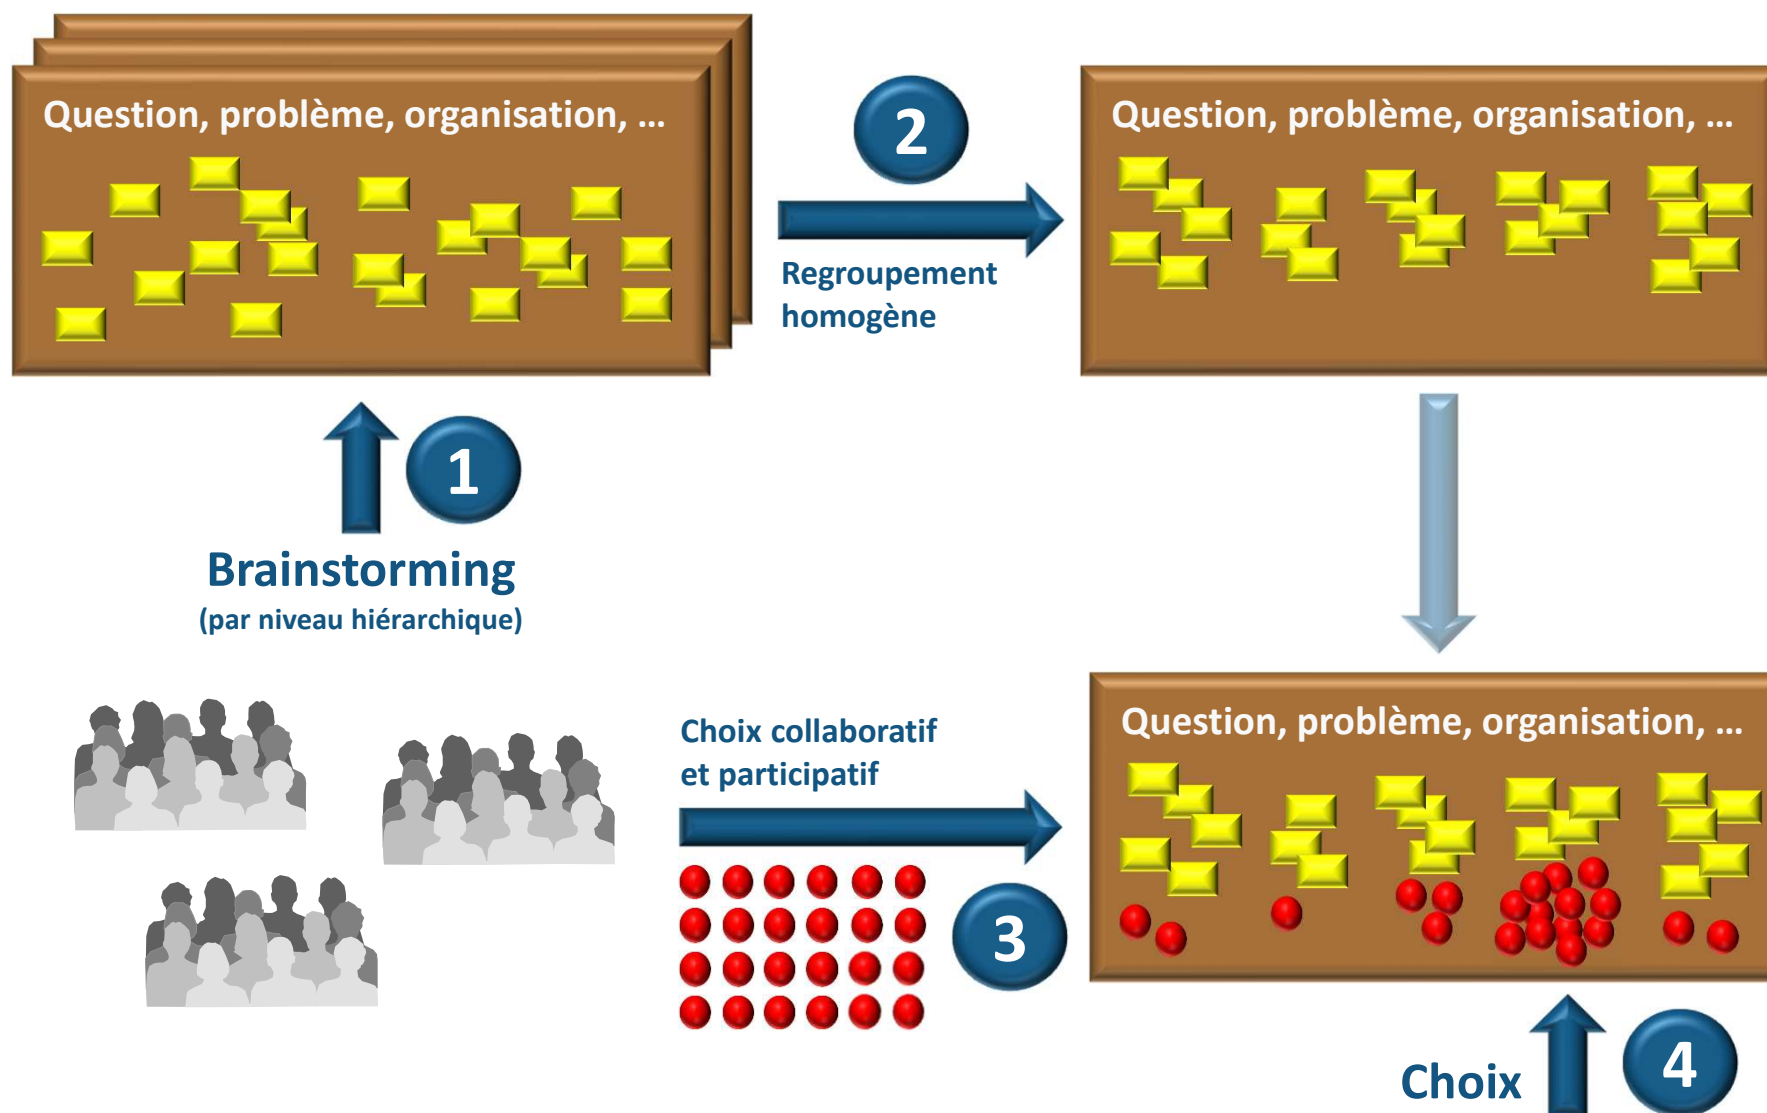


Les «outils» de diagnostic


PESTEL



Préalable potentiel
à l'analyse SWOT
(aide-mémoire)

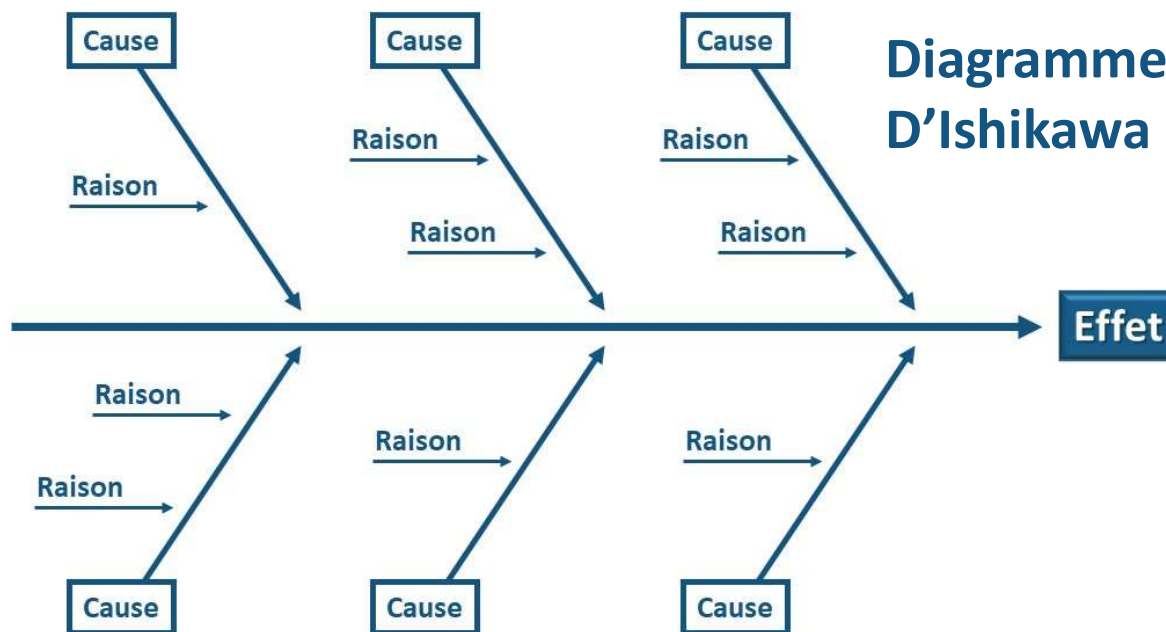

Les «outils» de diagnostic

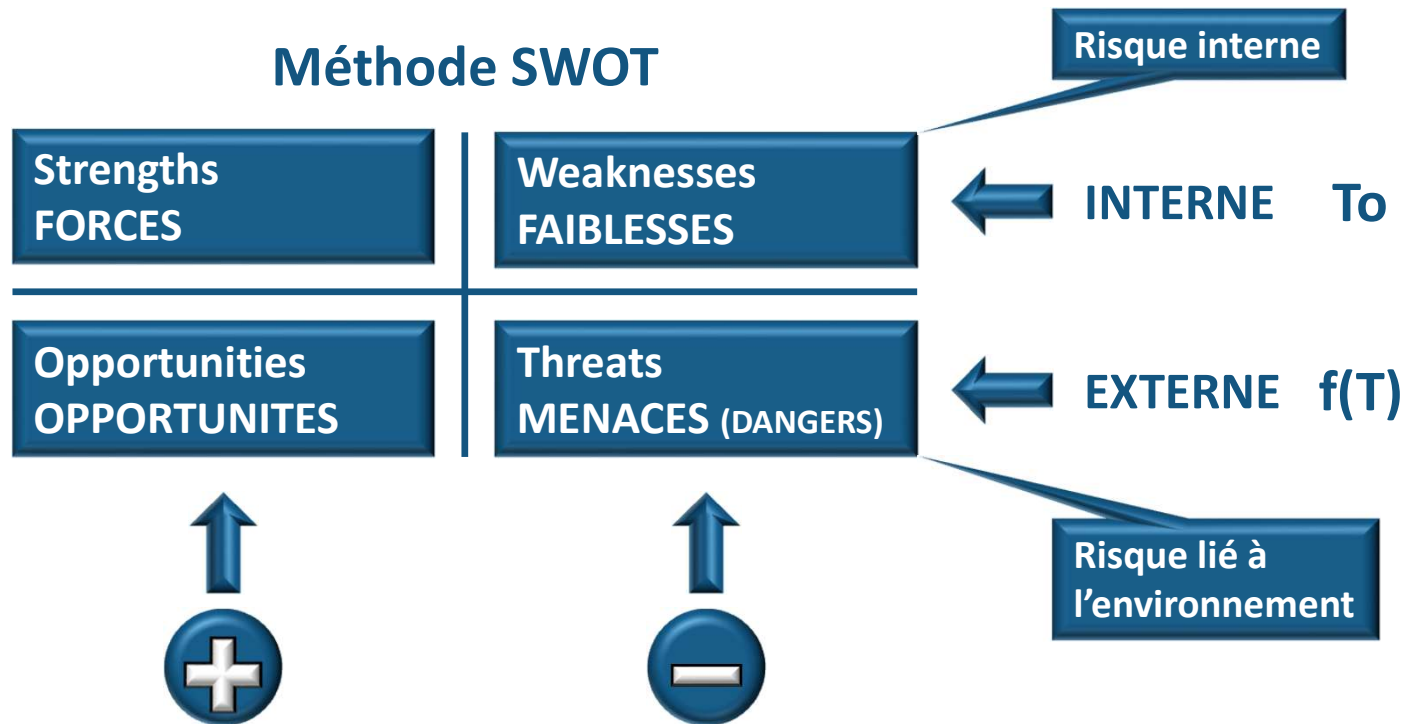

Classification des projets



Classification des projets

S	Specific
M	Measurable
A	Agreed, Achievable, Attainable, Appropriate
R	Realistic, Relevant, Results-oriented
T	Time framed, Timetabled

SMART

Spécifique


Mesurable

Ambitieux, atteignable

Réaliste, relevant

défini dans le Temps

Quelques méthodes utilisées

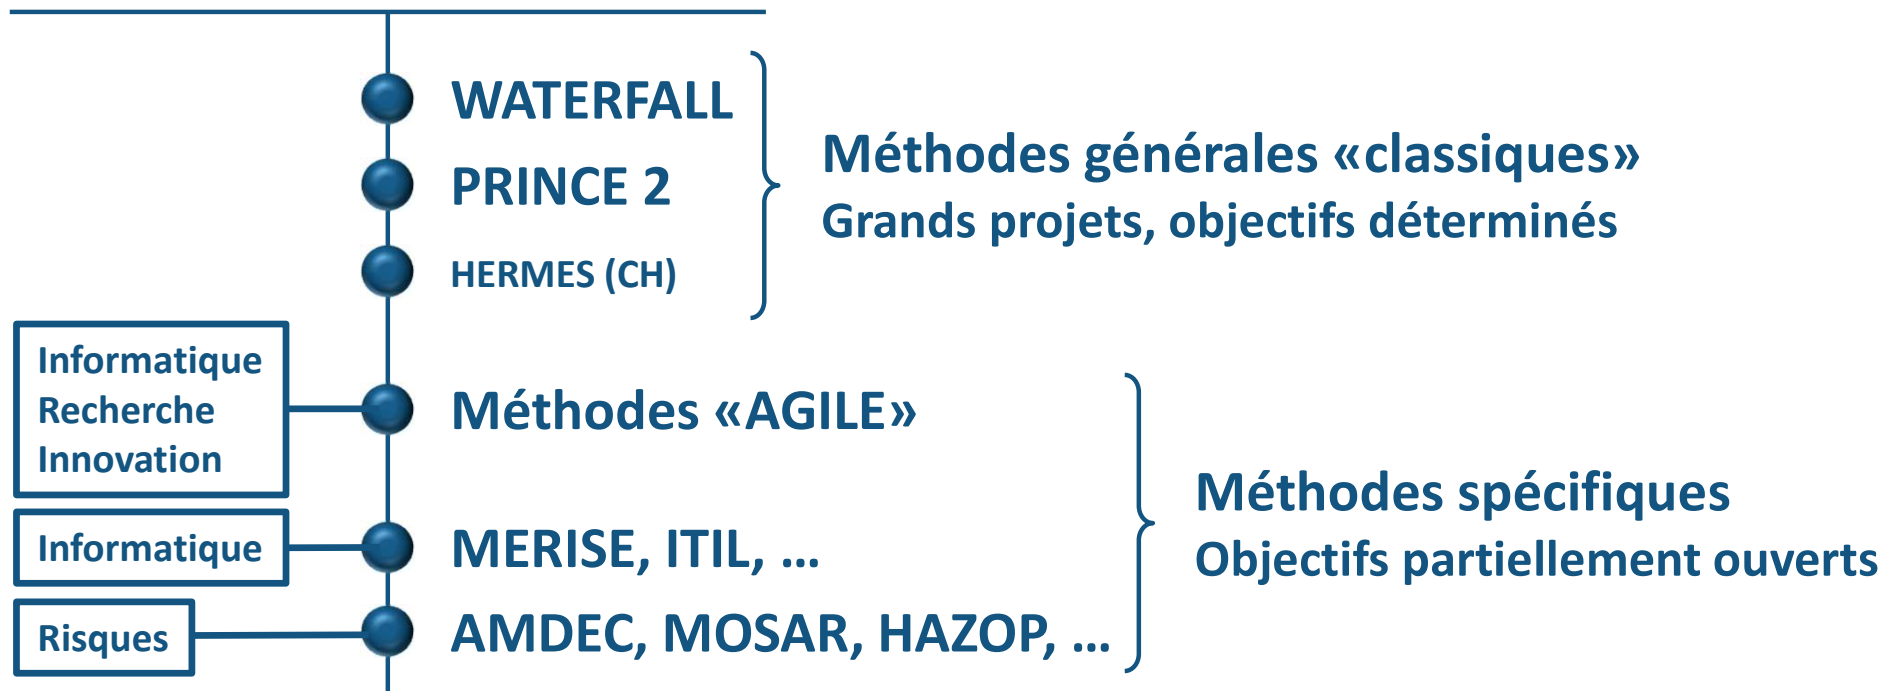

Certifications

- PMP/PMI
- IPMA




Méthodes générales «classiques»

Waterfall, Prince2, ...

Besoins identifiés stables
Projet logique, planifiable

Interactions fortes entre les phases de projets

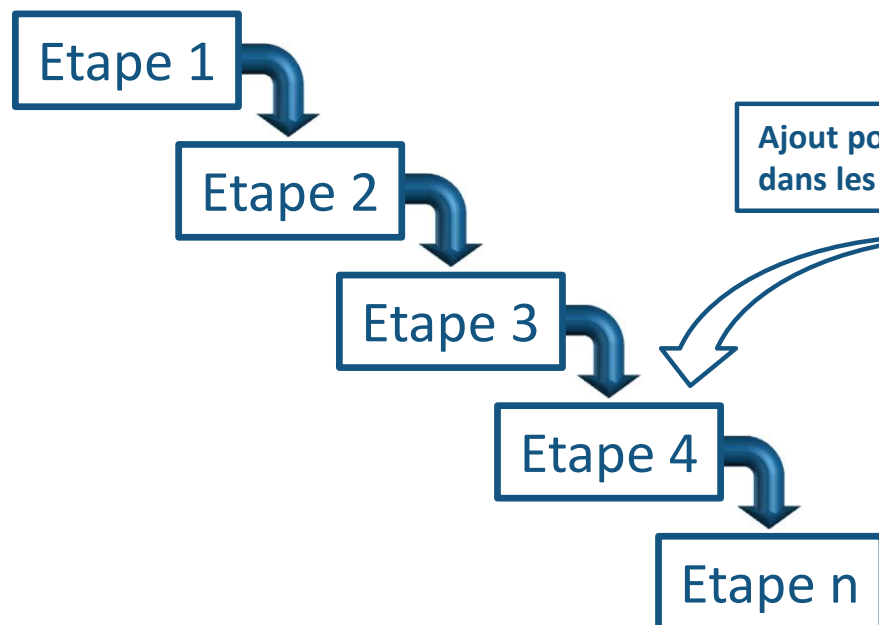

Méthodes «AGILE»


Scrum, ...

Besoins «ouverts», changeant
Projet structurable/parties


Manifeste AGILE (2001)

- Approche interactif et collaboratif
- Lien fréquent avec les «Clients»

Ajout ponctuel d'agilité
dans les méthodes classiques

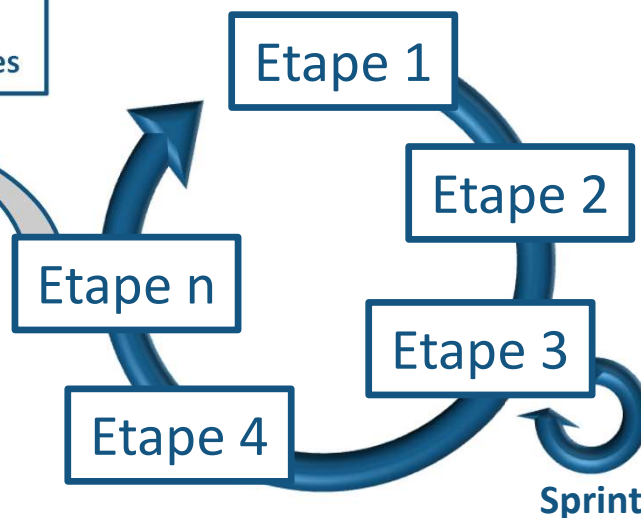


Exemple: PRINCE2 (process)

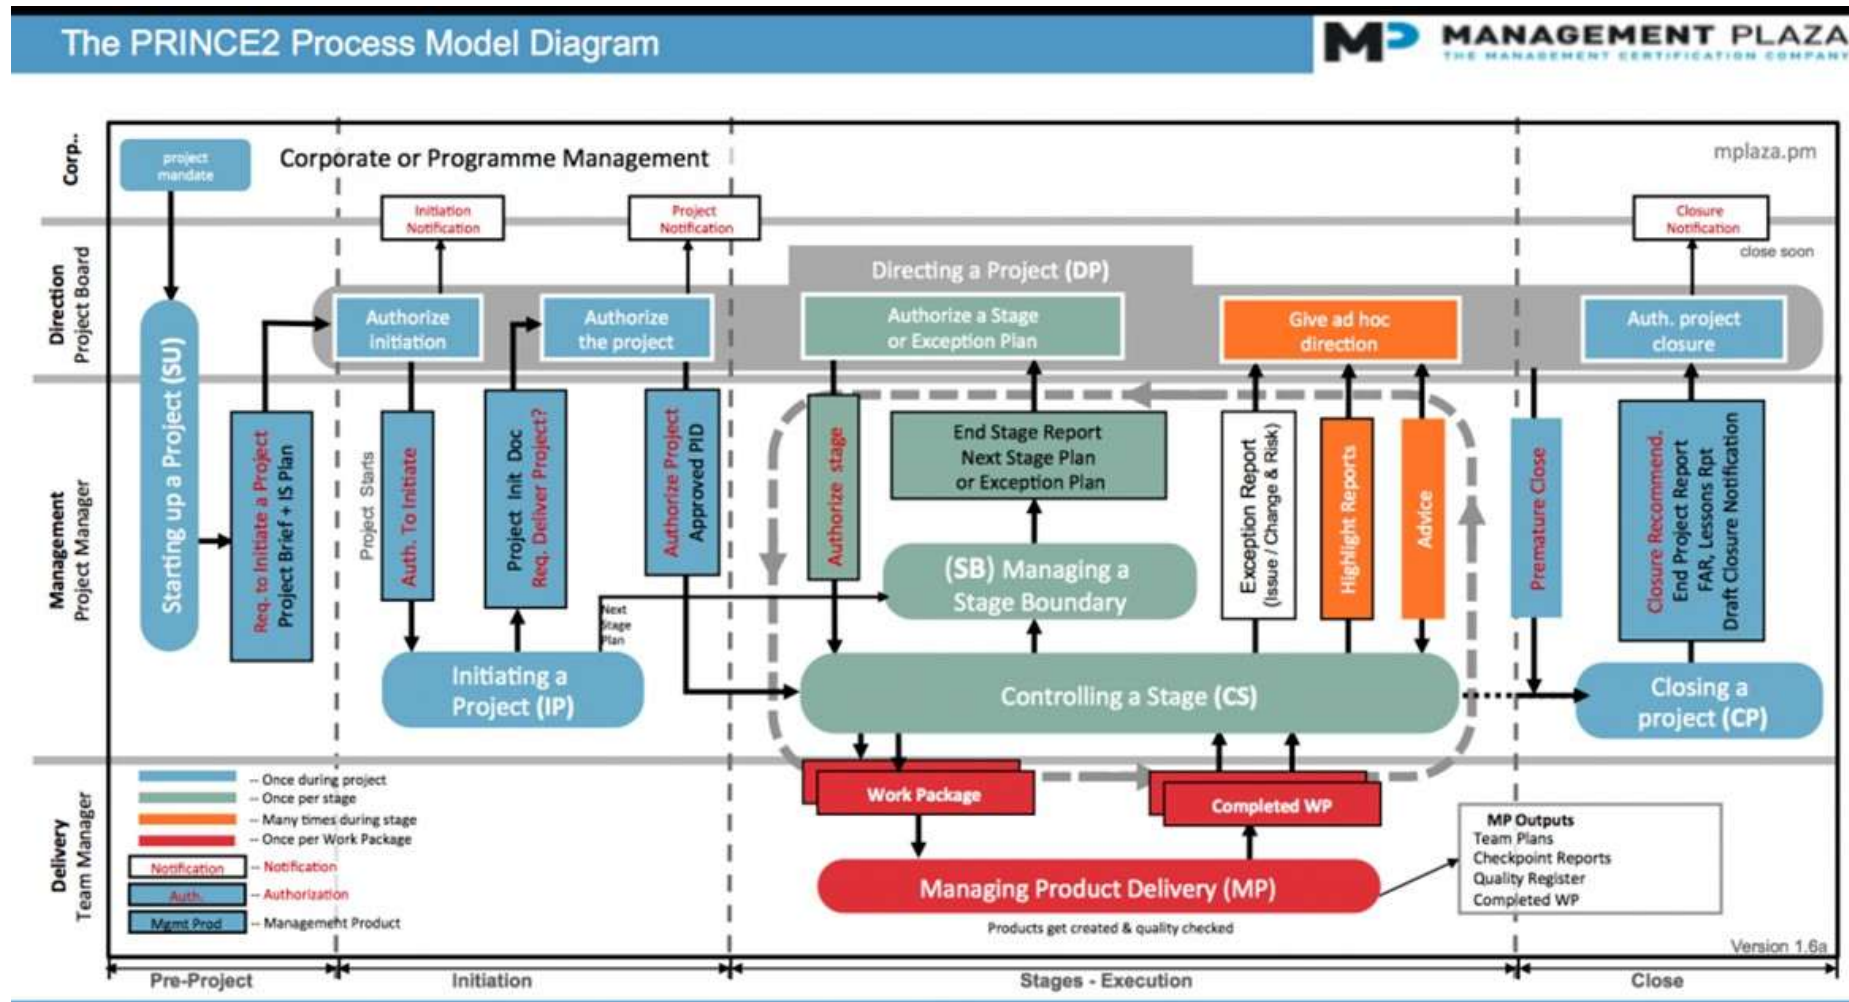


Causes d'échecs de projets

Q: Of the projects started in your organization in the past 12 months that were deemed failures, what were the primary causes of those failures? (Select up to 3)

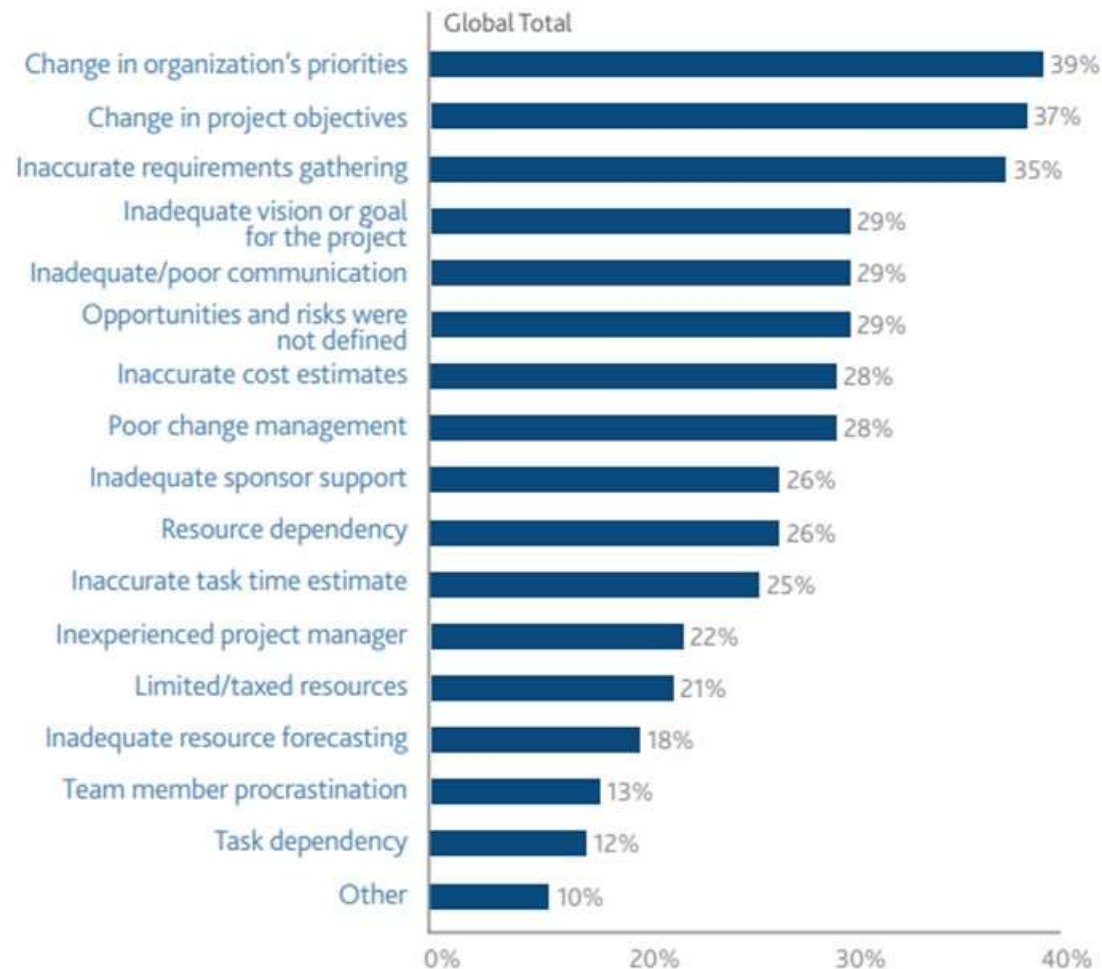

- Facteurs de succès:**
- objectif clair, partagé
 - besoins couverts
 - choix objectifs
 - budget et financement
 - évaluation et maîtrise des risques
 - structure et organisation de projet
 - communication
 - information partagée
 - système d'information
 - disponibilité des ressources
 - planification
 - suivi-contrôle, reporting
 - conduite du changement (y.c. formation)
 - clôture du projet




Mise en place de méthodologies et d'outils

Pourquoi des outils ?


- clarté
- objectivité
- rigueur

pour évaluer
pour anticiper
pour choisir
pour planifier et gérer
pour communiquer
pour suivre
pour contrôler


- Communication
- Partage
- Vision commune



Collaboration


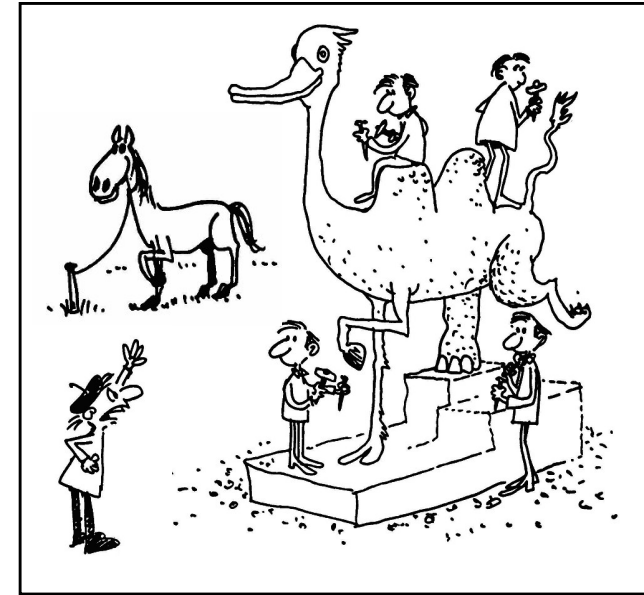


Objectifs clairs et partagés

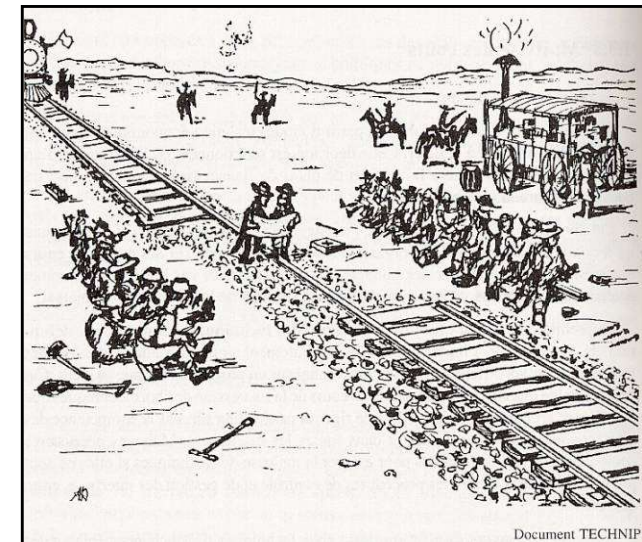


Planification, suivi-contrôle

Pourquoi des outils ?

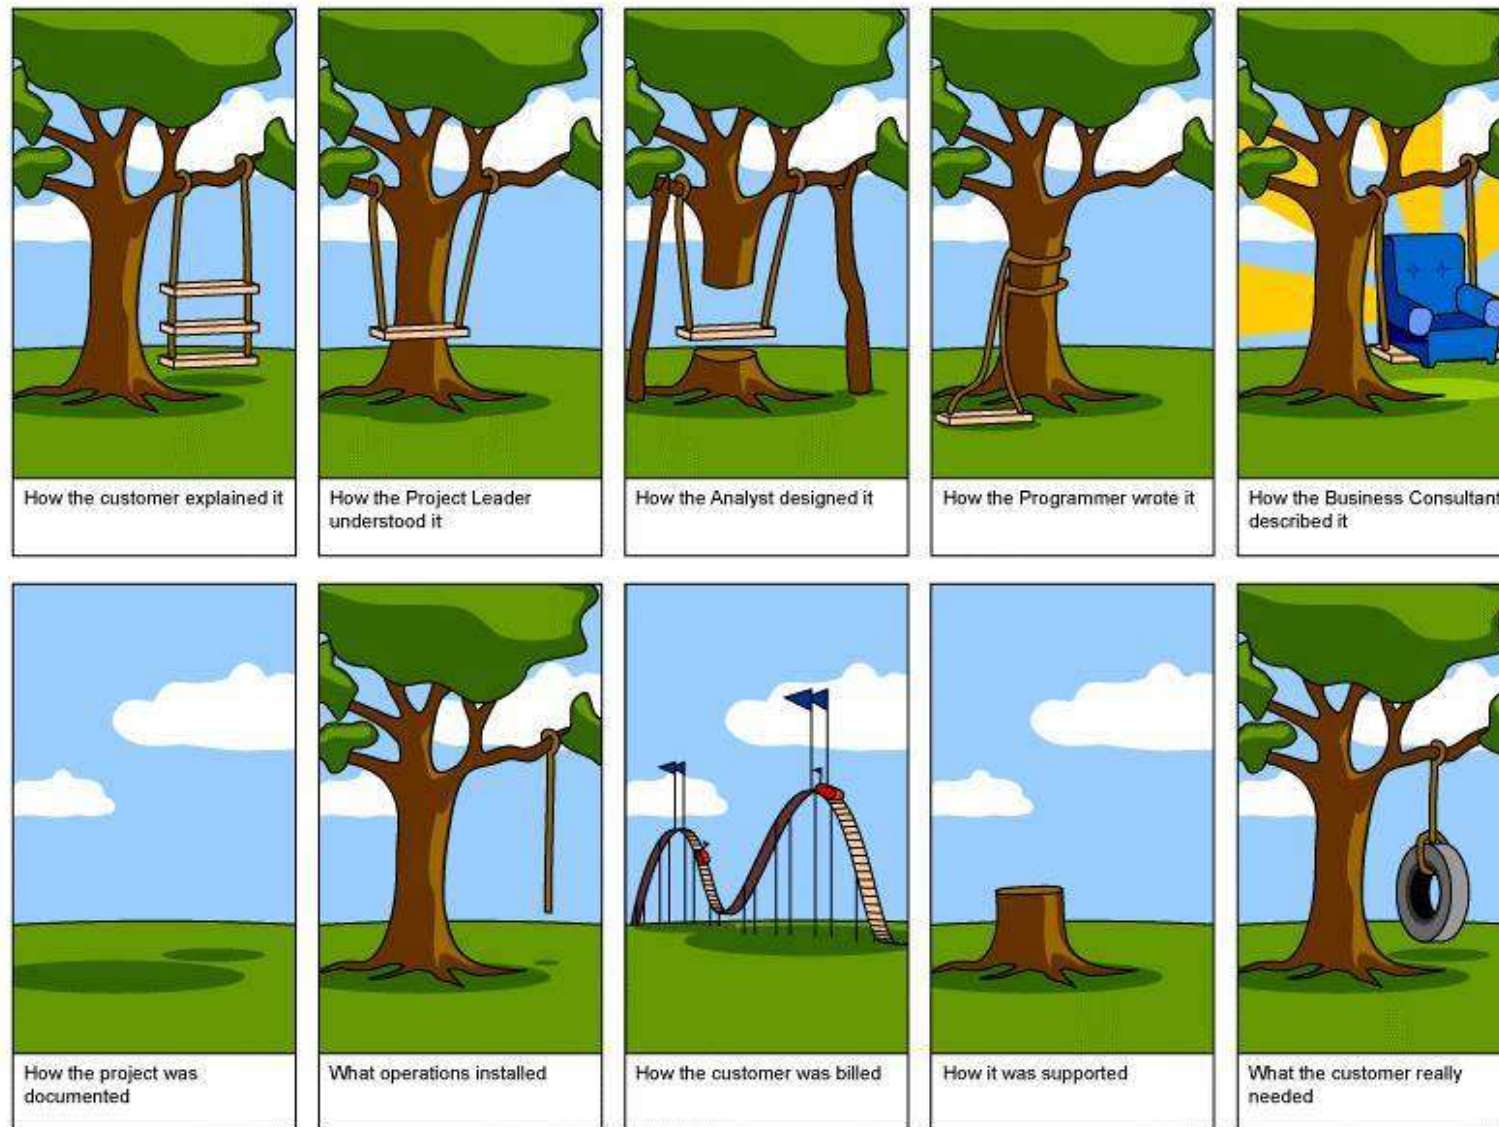


**Objectif
du projet**

Collaboration internationale (différences de cultures)

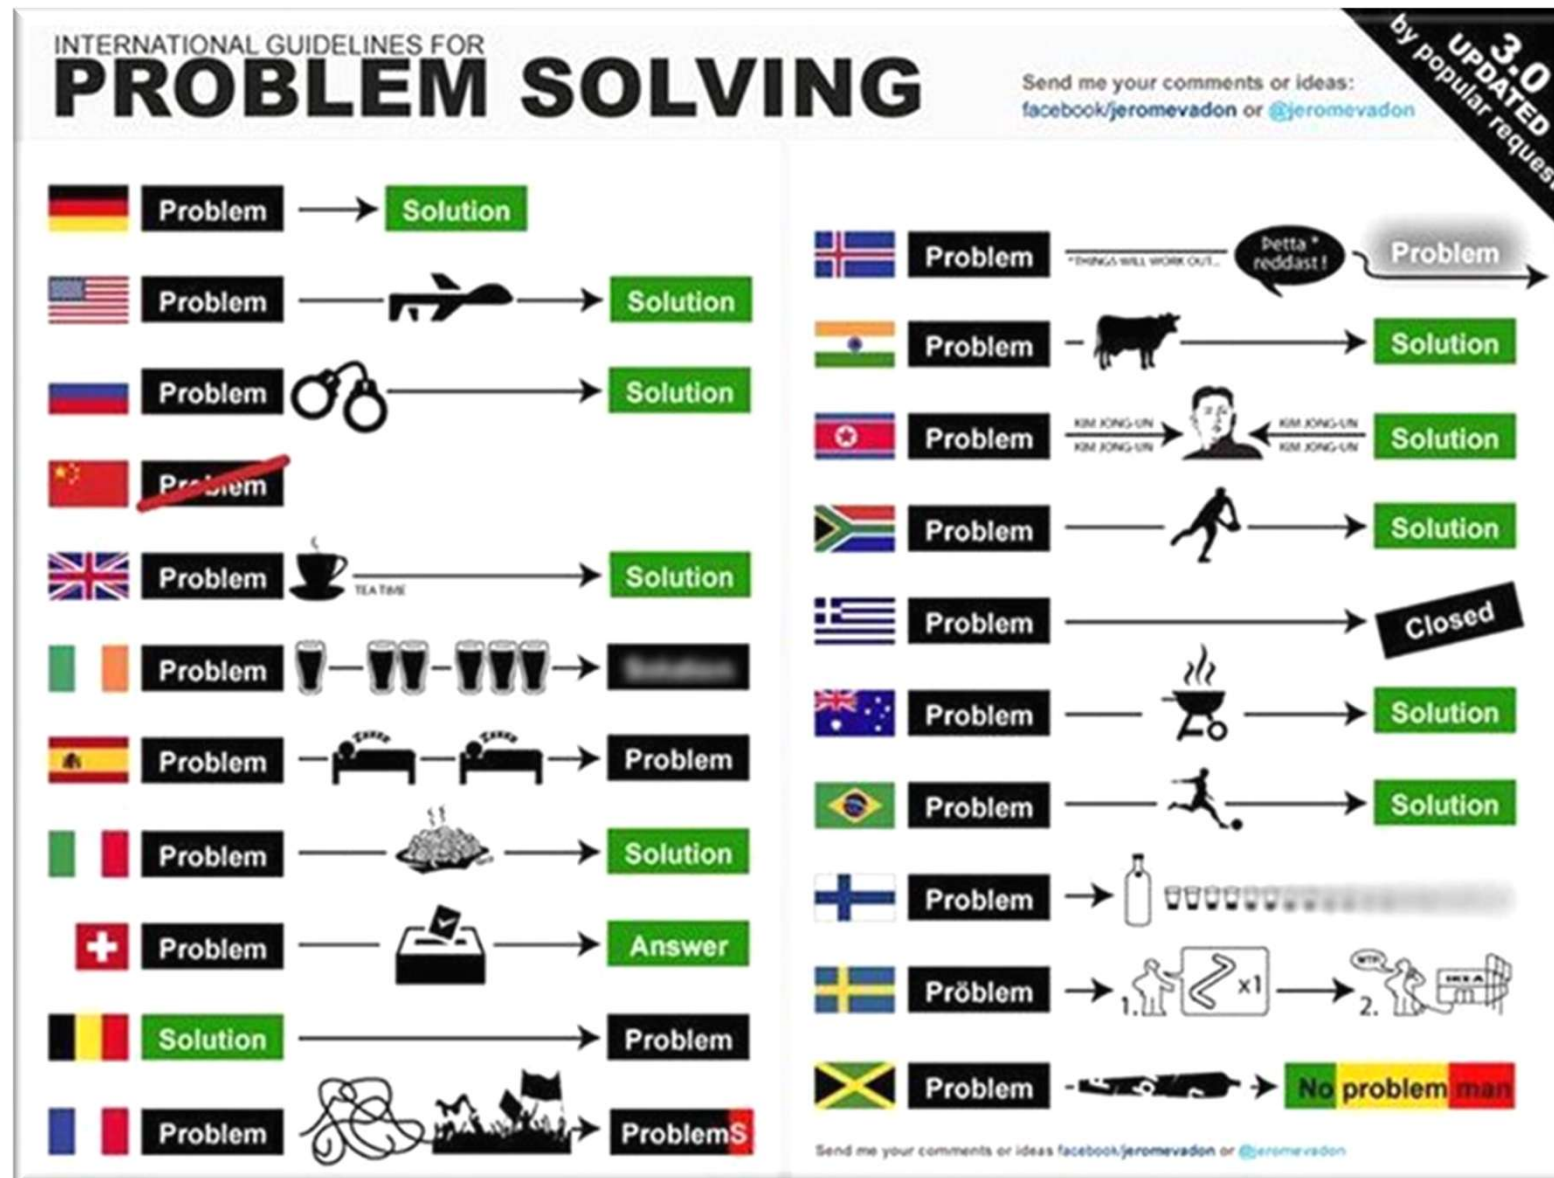


Pourquoi des outils ?

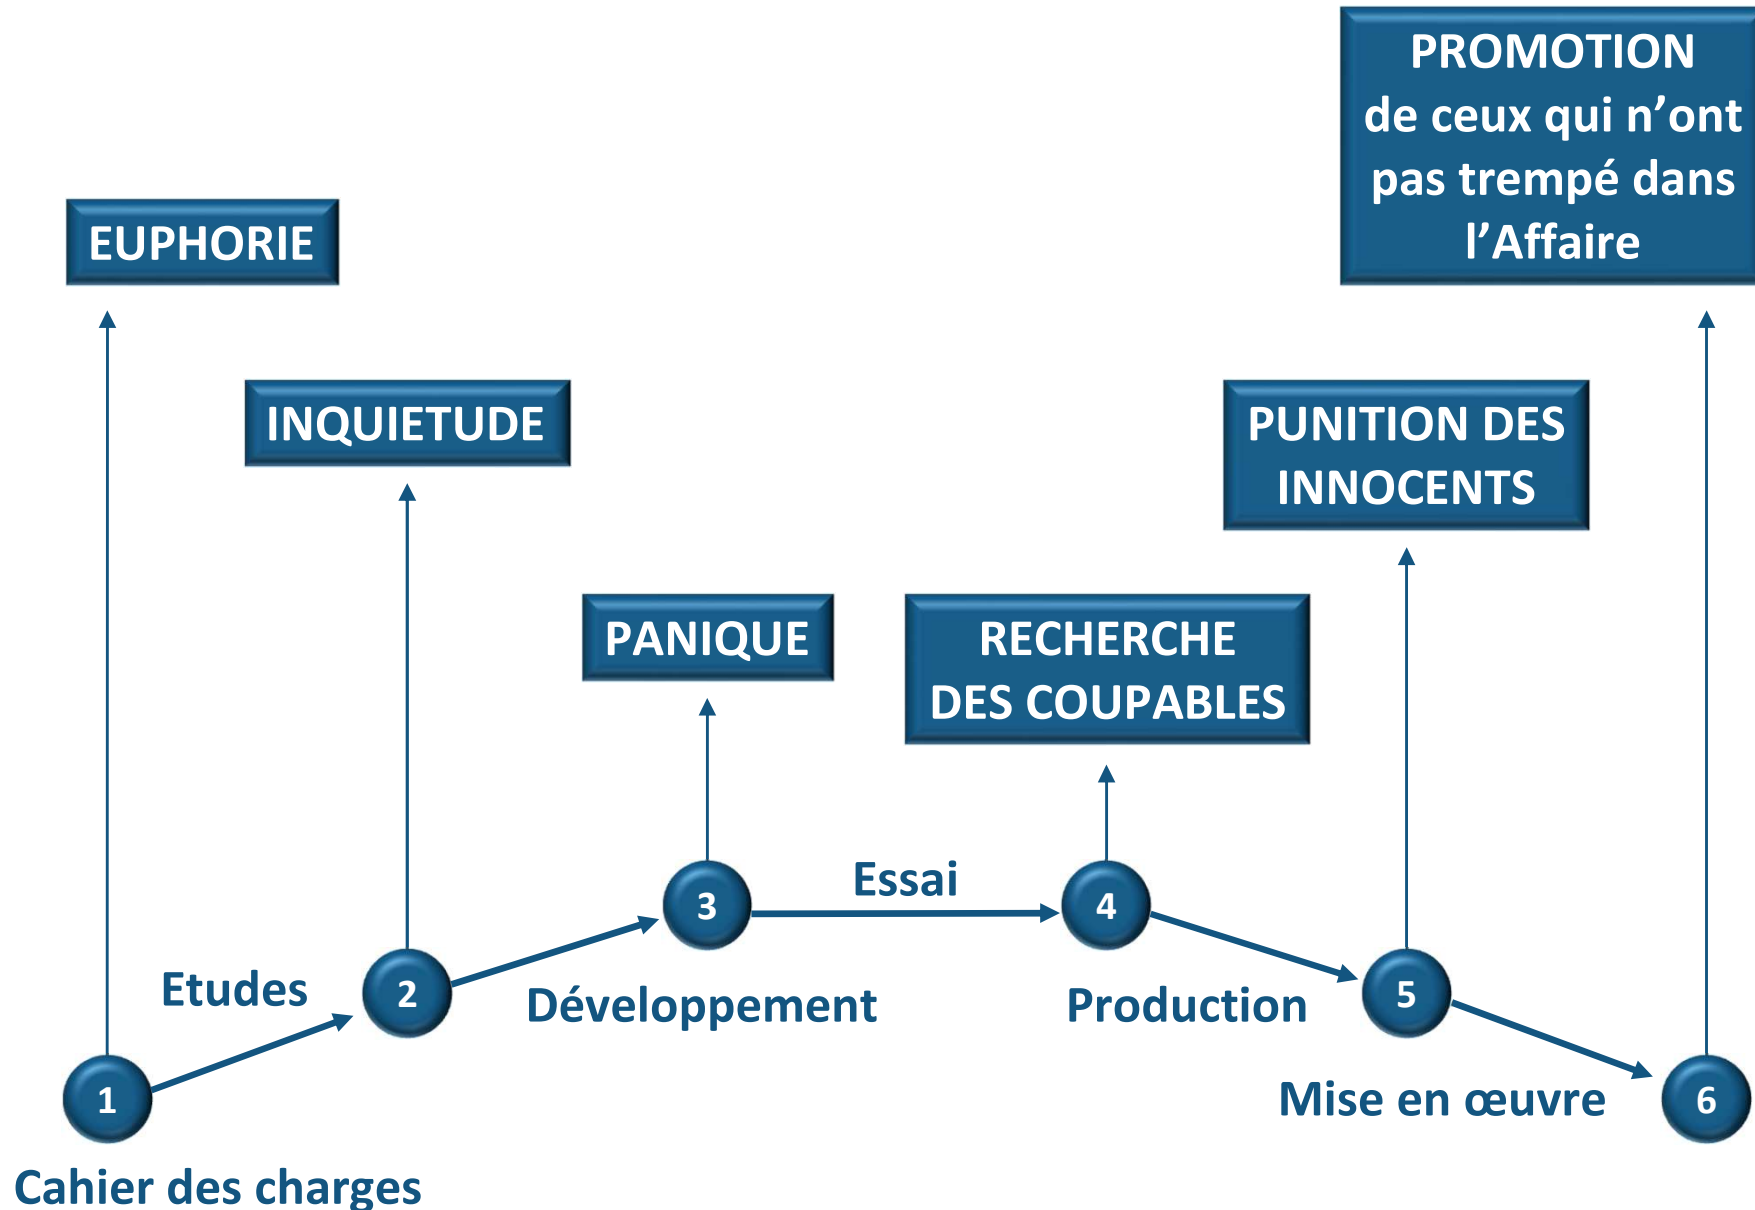

D'après Gassé

Pourquoi des outils ?

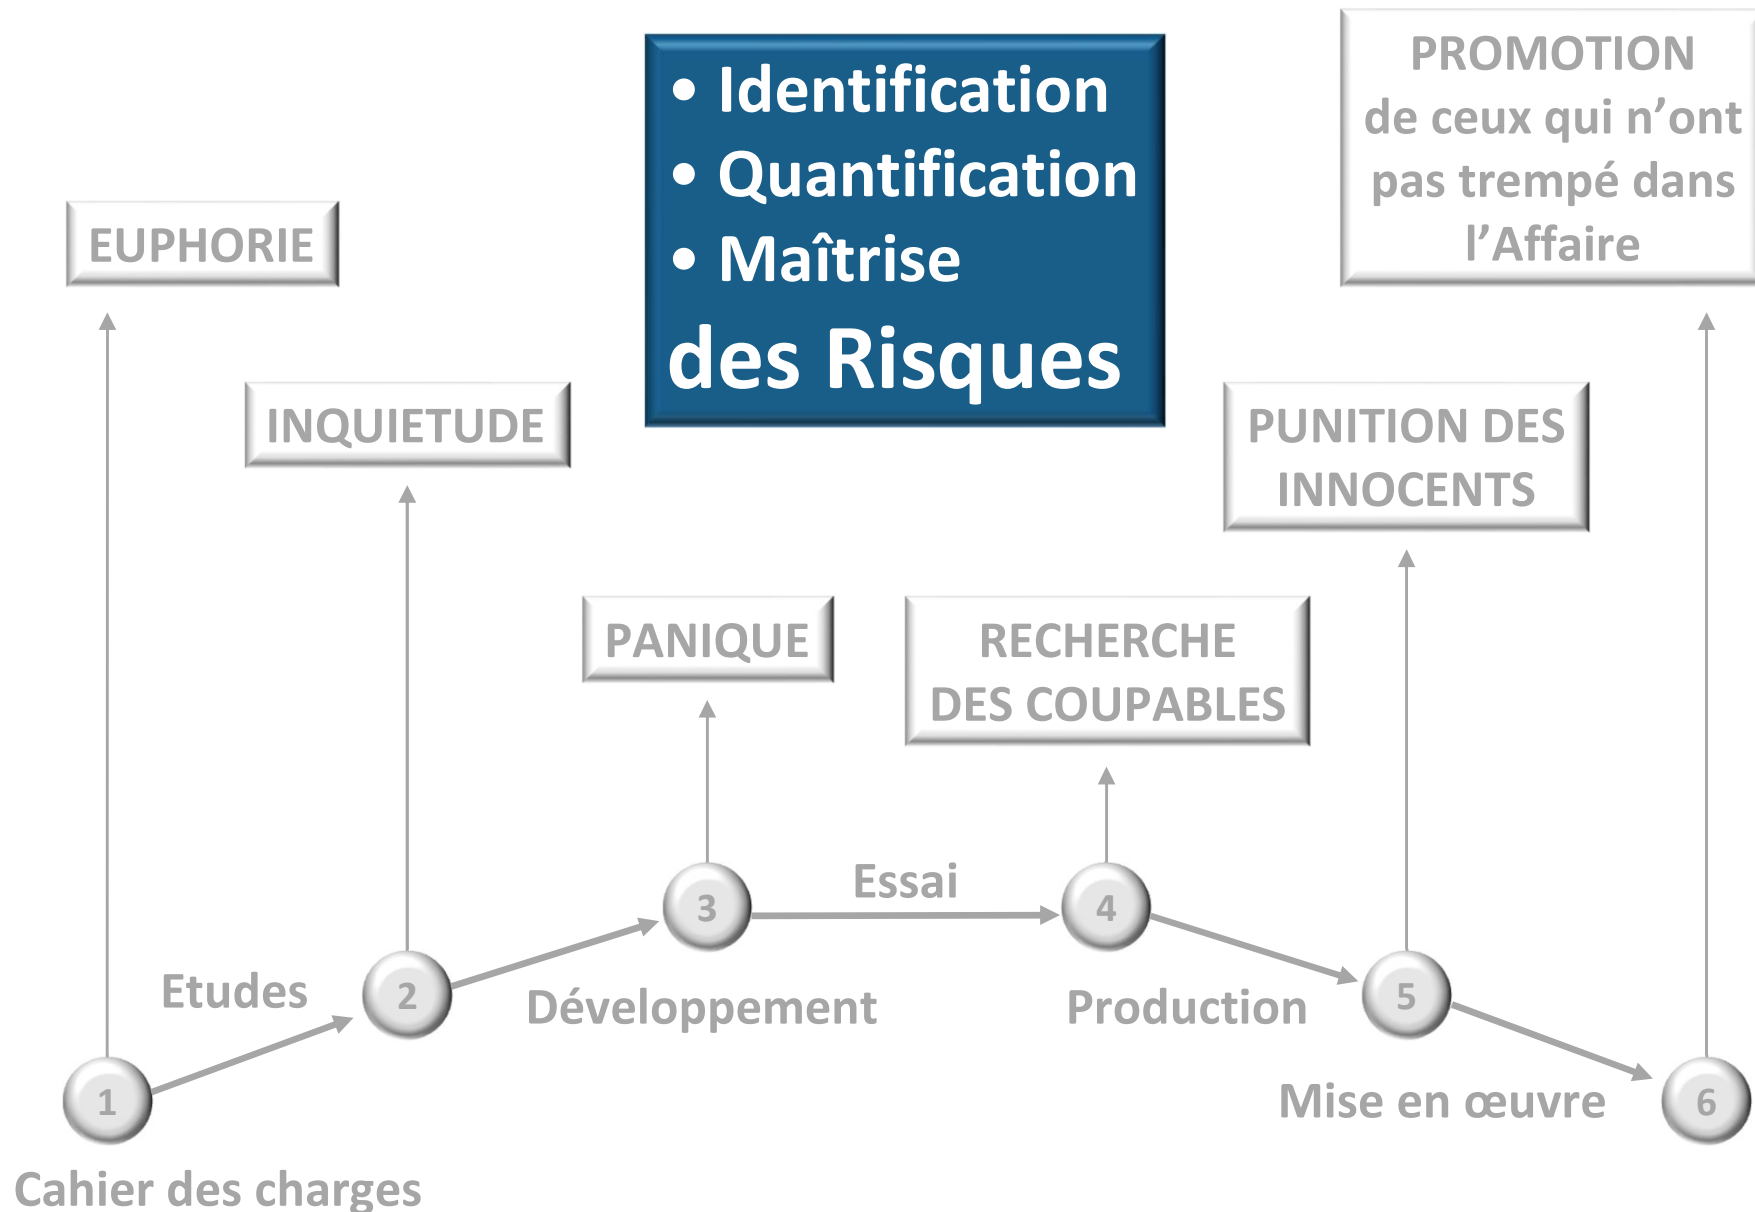*D'après Gassé*

Méthodes et outils communs à toutes méthodologies de management de projet

